

کارفرما: تعاونی مسکن شمیران

شماره گزارش : ۳۱

مدیر طرح: مهندسین مشاور منشور اقلیم سازه

تاریخ تنظیم : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

منشور اقلیم سازه
(سهامی خاص)



گزارش عملکرد دوره ای

انجام خدمات مدیریت طرح پروژه مشارکت در ساخت تعاونی مسکن شمیران

اردیبهشت ماه

سال ۱۴۰۲



ساختمان های مسکونی •

ساختمان تجاری •

ساختمان های اداری •

ساختمان های صنعتی •

محیط زیست •

فضای سبز •

سازه •





قرارداد خدمات مدیریت طرح پروژه مشارکت در ساخت تعاونی مسکن شمیران

بخش اول: گزارش عملکرد شریک

گزارش ماهیانه شماره ۳۱- اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲
کارفرما: تعاونی مسکن شهرداری منطقه یک تهران (شمیران)
مدیر طرح: شرکت مهندسين مشاور منشور اقليم سازه
شریک: گروه مهندسی پژمان جوزی و همکاران



فهرست مطالب

۳.....	مشخصات قرارداد
۵.....	فعالیت‌های انجام شده
۱۳.....	عملیات ساخت
۳۹.....	گزارش پیشرفت فیزیکی
۴۱.....	منابع پروژه
۴۴.....	فهرست کارهای پیش بینی شده لازم الاجرا
۴۶.....	گزارش تصویری



۱- خلاصه قرارداد مشارکت:

قرارداد شماره ۹/ت/م/۱۴۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ با موضوع زیر فی مابین شرکت تعاونی مسکن شمیران کارمندان شهرداری منطقه ۱ و گروه مهندسی پژمان جوی و شرکاء با مشخصات ذیل منعقد گردیده است:

جدول شماره ۱ - مشخصات موضوع قرارداد بر اساس پروانه ساختمانی اخذشده توسط تعاونی

ردیف	شرح	توضیحات
۱	موضوع و تعهدات کلی قرارداد:	مشارکت در ساخت شش دانگ پلاک ثبتی ۲۵ اصلی از ۳۹۳۶ فرعی، قطعه نهم ملکی شرکت تعاونی مسکن شمیران کارمندان شهرداری منطقه ۱ (که شریک متعهد میگردد مطابق پروانه ساختمانی صادره به شماره ۱۰۰۲۰۲۳۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۲ در پرونده شهرداری ۱۰۰۶۲۹۰۳ ضمن پرداخت تمامی هزینه های ساخت نسبت به مدیریت، سرمایه گذاری، طراحی، ساخت کل مجتمع و همچنین تعمیر و نگهداری یکساله تأسیسات و تجهیزات مجتمع، در قطعه زمین متعلق به تعاونی واقع در تهران، بزرگراه ارتش، بلوار اوشان، بلوار ۳۵ متری، جنب پروژه مخابرات به شرح ذیل و انجام محوطه سازی و دیوارکشی کل پروژه و سایر موارد طبق ضوابط شهرسازی و مقررات ملی زمین و مسکن و سایر ضوابط به همراه تجهیز و برچیدن کارگاه با کلیه کارهای مربوطه طبق نقشه های اجرایی و مشخصات فنی که در ادامه اجرای این قرارداد توسط شریک تهیه و به تأیید تعاونی میرسد.
۲	طرف اول (تعاونی):	تعاونی مسکن شمیران (کارمندان شهرداری منطقه ۱)
۳	طرف دوم (شریک):	گروه مهندسی پژمان جوی و همکاران
۴	شماره و تاریخ قرارداد:	قرارداد شماره ۹/ت/م/۱۴۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۵	میزان سهم مشارکت	سهم تعاونی: ۵۲ درصد
		سهم شریک: ۴۸ درصد
۶	زمانبندی کلی پروژه	مدت قرارداد: ۴۸ ماه
		تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
		مدت تجهیز کارگاه: ۲ ماه
		مدت طراحی و اجرا: ۴۶ ماه
		دوره نگهداری: ۱۲ ماه پس از تحویل موقت
		تاریخ تحویل موقت: ۱۴۰۳/۰۳/۱۸
		تاریخ تحویل قطعی: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸



جدول شماره ۲ - مشخصات زمین قرارداد بر اساس پروانه ساختمانی اخذ شده توسط تعاونی

ردیف	شماره پلاک	مساحت عرصه (مترمربع)	کاربری	مساحت زیربنای مجاز طبق پروانه ساختمانی شماره ۱۳۹۱/۰۹/۱۲ مورخ ۱۰۰۲۰۲۳۸ (مترمربع)
۱	۲۵ اصلی از فرعی ۳۹۳۶ قطعه ۹	۷۲۲۵ / ۷۲ متر مربع با توجه به توضیحات تبصره ۱ بند ۳-۱ ماده ۳ قرارداد و زمین تحويل شده معادل ۶۸۷۳,۶ متر مربع بر اساس پلان نقشه برداری شده	مسکونی	۶۷۷۰۵
			تجاری	۳۰۰۰
			پارکینگ مسکونی	۲۳۸۷۲
			پارکینگ تجاری	۲۲۶۰
			پله و آسانسور	۱۵۰۱۳
			محوطه سازی	سطح موجود





۲- فعالیت های انجام شده تا کنون:

۲-۱- موارد حقوقی و قراردادی:

۲-۱-۱- رفع معارض :

- اصلاح ابعاد زمین در جهت رفع هر گونه معارض
- رفع توقیف سند زمین (توضیح اینکه بدلیل عدم پرداخت عوارض مربوط به سازمان تامین اجتماعی سند زمین توقیف بوده است)
- اخذ نامه از شهرداری بابت لزوم خاکبرداری محدوده بین خط گود و زمین ملک مجاور (برج ستاره) و ابلاغ به مالکین مربوطه (تعاونی مسکن مخابرات).
- تمدید جواز ساختمان تا پایان سال ۱۴۰۰

۲-۲- تامین زیر ساخت ها :

۲-۲-۱- سیستم های ارتباطی:

- اخذ انشعاب تلفن ۱۰ خط
- سیستم سانترال برای خط داخلی تلفن و برقراری شبکه داخلی (Intera Net)
- برقراری اینترنت کابلی و وای فای

۲-۲-۲- برق رسانی:

- تامین برق توسط سه دستگاه ژنراتور ۱۰۰ کاوا (KVA) و یک دستگاه ژنراتور جدید ۵۵۰ (KVA)
- اخذ انشعاب برق کارگاهی ۲۵۰ آمپر

۲-۲-۳- انشعاب گاز کارگاهی:

- اخذ انشعاب گاز کارگاهی با ظرفیت جی ۲۵
- لوله کشی گاز داخل کارگاه جهت موتور خانه

۲-۲-۴- انشعاب آب :

- نصب دو منبع آب (به ظرفیت کل ۱۵۰۰۰ لیتر) و نصب تصفیه خانه برای مصارف بهداشتی
- تامین آب آشامیدنی توسط تانکر
- خرید انشعاب آب اصلی پروژه

۳-۲- تجهیز کارگاه :

۳-۲-۱- آماده سازی زمین:

- پیاده سازی نقاط نقشه برداری روی زمین
- تسطیح و حصارکشی دور زمین
- نصب درب ورودی کارگاه
- اجرای فضای سبز ورودی کارگاه
- شن ریزی مستمر جهت جلوگیری از گل و لای شدن مسیر های تردد
- اجرای آسفالت سرد محوطه و بتن ریزی در برخی قسمتهای دارای تردد بالا



۲-۳-۲- تامین فضای استقرار نفرات:

- زیر سازی و اجرای شاسی فلزی جهت نصب کانکس ها
- تهیه و نصب و میلان ۲۵ دستگاه کانکس دفتری (دو دستگاه در اختیار نمایندگان تعاونی)
- تهیه و نصب ۳۵ دستگاه کانکس جهت پیمانکاران جزء و اسکان نیروهای کارگری
- تامین ۷ دستگاه کانکس جهت آبدارخانه و سرویس بهداشتی برای مجموعه های دفتری و کارگری
- تامین سرمایش کلیه کانکس ها از طریق کولر آبی و اسپیلیت
- تامین گرمایش کلیه کانکس ها از طریق سیستم موتورخانه مرکزی و شوفاژ
- احداث اسکلت فلزی و نصب کانکس در مجاور کانکس های دفتری موجود در حاشیه پیاده رو خیابان دریا
- آماده سازی و تجهیز خوابگاه کارگری استیجاری به ظرفیت حدود ۸۰ نفر جهت اسکان نیروهای ساخت اسکلت بتنی

۲-۳-۳- کنترل تردد و حفاظت فیزیکی پروژه:

- عقد قرارداد حفاظت فیزیکی با گروه حراست مورد تأیید نیروی انتظامی و نگهبانی ۲۴ ساعته کارگاه
- نصب و راه اندازی سیستم دوربین مدار بسته شامل ۴۰ دستگاه دوربین در سطح پروژه و مانیتورینگ در کانکس مربوطه
- نصب سیستم کنترل حضور و غیاب
- احداث اتاق نگهبانی ۲۴ ساعته در سه ورودی کارگاه

۲-۳-۴- تامین زمین جهت تجهیز کارگاه:

- اجاره زمین مجاور شرقی به مساحت حدود ۱۱۰۰۰ متر مربع
- تسطیح زمین و تخلیه نخاله ها و وسایل اضافه از آن
- حصارکشی دور زمین مربوطه
- نصب درب کارگاهی جهت تردد ماشین آلات سنگین
- احداث اتاقک نگهبانی ۲۴ ساعته در ورودی زمین
- احداث پارکینگ مسقف جهت خودروهای مدیران

۲-۳-۵- ساختمان های پشتیبانی:

- تامین دو دستگاه کانتینر به عنوان انبار
- احداث فضای انبار روباز بین دو کانتینر
- تامین فضای سایت آرماتور.
- احداث موتورخانه شوفاژ
- برچیدن سقف تعمیرگاه بنا به هشدار ایمنی اداره برق
- ایمن سازی ساختمان تعمیرگاه در مقابل برق فشار قوی و شروع به اجرای سقف غیرفلزی برای آن
- احداث اتاق آزمایشگاه
- نصب تجهیزات آزمایشگاه که به دلیل عدم معرفی آزمایشگاه به مدیریت طرح، امکان کنترل عملکرد آن فقط از طریق بررسی گزارشات آزمایشگاهی امکان پذیر است.

۲-۳-۶- تاسیسات و تجهیزات کارگاهی:

- تامین و نصب کامل یک دستگاه باسکول ۶۰ تن
- تامین و نصب دو دستگاه سیلوی سیمان ۱۰۰ تنی
- خرید و نصب یکدستگاه بچینگ ۰.۵ متر مکعبی
- نصب ستون های فلزی، نصب پانل های پیش ساخته و تکمیل دیواره های جداکننده مصالح بچینگ



- تکمیل محل بارگیری تراک ها در بچینگ
- برق رسانی و آبرسانی به بچینگ
- تامین مصالح شن و ماسه و سیمان
- احداث حوضچه پساب دوم بچینگ
- احداث حوضچه پساب سوم
- نصب مخزن ذخیره پساب و خط پمپاژ

۲-۳-۷- تامین ماشین آلات سنگین:

- تامین و نصب مخزن گازوئیل برای سوخت ماشین آلات
- تامین یک دستگاه لودر
- تامین یک دستگاه پمپ بتن زمینی و ملحقات مربوطه
- تامین و اورهال و نصب یک دستگاه تاور کرین ۱۲ تن پتن در ضلع شمالی
- تامین و اورهال و نصب یک دستگاه تاور کرین ۸ تن پتن در ضلع غربی
- تامین و اورهال و نصب یک دستگاه تاور کرین ۸ تن زوم لاین در ضلع جنوبی
- تامین و نصب دو دستگاه بالابر کارگاهی (آلیماک)
- تامین یک دستگاه میکسر بتن، یک دستگاه باب کت و یک دستگاه بنز خاور و نصب جرثقیل ۳ تن بر روی آن
- تامین سه دستگاه تراک میکسر و یک دستگاه پمپ زمینی
- تامین یک دستگاه جرثقیل سه تن
- تامین یک دستگاه جرثقیل ۱۳ تن
- ساخت اتاق سایلنت جهت ژنراتور ۵۰۰ کا و آ (در دست اقدام)
- تامین تانکر آب جهت تولید بتن و کیورینگ
- تامین یک دستگاه پلیسینگ بوم و انتقال به محل گود جهت تسریع در اجرای عملیات بتن ریزی

جدول شماره ۳ - گزارش وضعیت پیشرفت وزنی عملیات تجهیز کارگاه (درصد وزنی در کل پروژه معادل ۴ درصد)

الف) تجهیز اولیه (۳۵ درصد)							
W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	درصد پیشرفت فیزیکی
۳,۱,۱	تسطیح و محصور کردن زمین	کلی	۱	۱	۱۰۰	۳	۳
۳,۱,۲	تامین تانکر آب و ژنراتور	عدد	۲+۳	۲+۳	۱۰۰	۲	۲
۳,۱,۳	استقرار کانکسهای دفتری	عدد	۲۵	۲۵	۱۰۰	۴۵	۴۵
۳,۱,۴	استقرار کانکسهای کارگری	عدد	۳۵	۳۵	۱۰۰	۵۰	۵۰



جدول شماره ۳ - گزارش وضعیت پیشرفت وزنی عملیات تجهیز کارگاه (درصد وزنی در کل پروژه معادل ۴ درصد)

(ب) احداث ابنیه و تاسیسات پشتیبانی (۵۰ درصد)

W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	درصد پیشرفت فیزیکی
۳,۲,۱	تامین زمین	کلی	۱	۱	۱۰۰	۵	۵
۳,۲,۲	احداث موتور خانه	کلی	۱	۱	۱۰۰	۱۰	۱۰
۳,۲,۳	احداث انبار	کلی	۱	۱	۱۰۰	۵	۵
۳,۲,۴	احداث باسکول	کلی	۱	۱	۱۰۰	۱۵	۱۵
۳,۲,۵	احداث آزمایشگاه	کلی	۱	۱	۱۰۰	۱۰	۱۰
۳,۲,۶	احداث بچینگ	کلی	۱	۱	۱۰۰	۳۵	۳۵
۳,۲,۷	احداث تعمیرگاه	کلی	۱	۱	۱۰۰	۲۰	۲۰

(پ) اخذ انشعابات تاسیساتی (۱۵ درصد)

W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	درصد پیشرفت فیزیکی
۳,۳,۱	اخذ انشعاب تلفن و اینترنت	کلی	۱	۱	۱۰۰	۵	۵
۳,۳,۲	اخذ انشعاب گاز	کلی	۱	۱	۱۰۰	۱۵	۱۵
۳,۳,۳	اخذ انشعاب برق	کلی	۱	۱	۱۰۰	۳۰	۳۰
۳,۳,۴	اخذ انشعاب آب	کلی	۱	۱	۱۰۰	۵۰	۵۰

۳۵

جمع کل پیشرفت تجهیز اولیه

۵۰

جمع کل پیشرفت احداث ابنیه و تاسیسات پشتیبانی

۱۵

جمع کل پیشرفت اخذ انشعابات تاسیساتی

۴ درصد


جمع کل پیشرفت فیزیکی عملیات تجهیز کارگاه



جدول شماره ۳ - گزارش وضعیت پیشرفت وزنی عملیات تجهیز کارگاه (درصد وزنی در کل پروژه معادل ۴ درصد)

۴ درصد	پیشرفت فیزیکی مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلی در پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲
•	وضعیت تقدم (+) و یا تاخر (-) عملیات اجرایی نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلی

نمودار ستونی پیشرفت تجهیز کارگاه

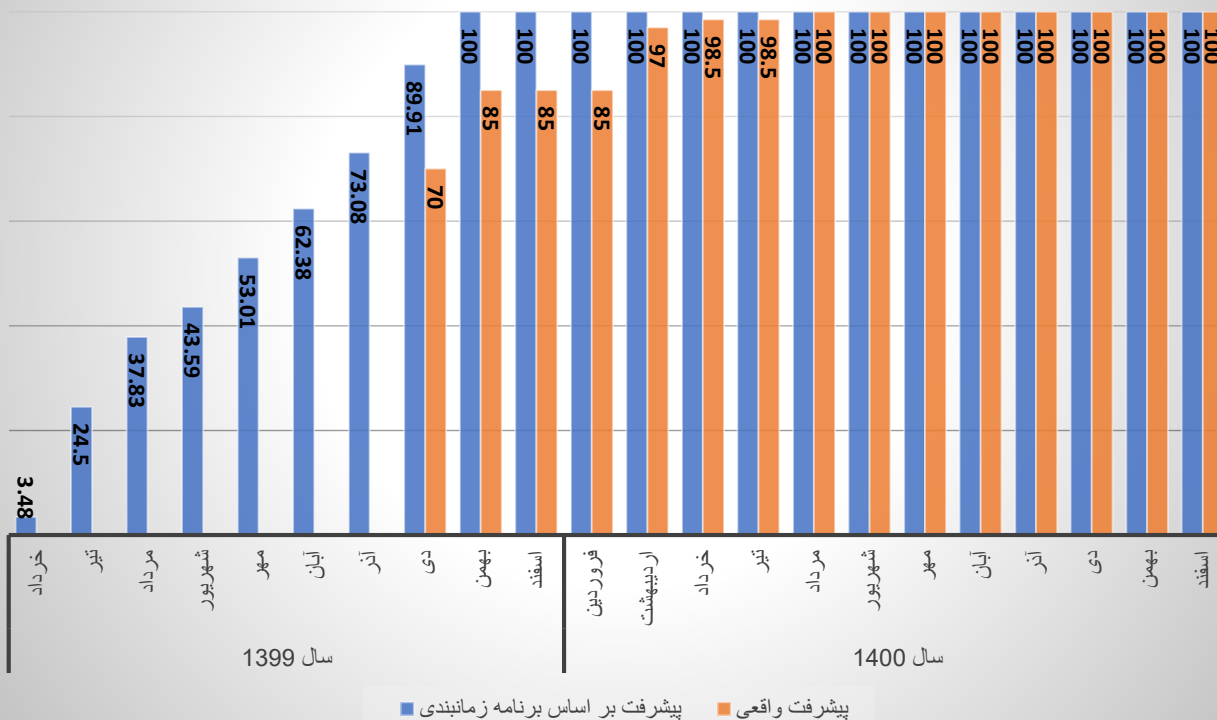



۴-۲- طراحی:

توضیح: (بنا بر اطلاعات اخذ شده از شریک محترم و جلسات برگزار شده) همزمان با عقد قرارداد ، تیم های طراحی پروژه انتخاب شده اند و تاکنون اقدامات زیر در فرایند طراحی انجام شده است.

۴-۲-۱- پایدارسازی (اتمام عملیات)

- انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار (شرکت بسپار پی ایرانیان)
- بازدید میدانی و مطالعات زمین شناسی
- طراحی سیستم پایدارسازی گود
- طراحی سیستم پایدارسازی مجاور برج ستاره

۴-۲-۲- طراحی اصلی ساختمان:

- عقد قرارداد با تیم های طراحی
- تهیه طرح اولیه معماری و ارائه به تعاونی
- تنظیم جدول تفکیک واحد ها بر اساس ایده نهایی و نقشه های فاز یک تهیه شده و تقسیم بندی واحد ها بین طرفین قرارداد (تعاونی و شریک)
- نهایی شدن هماهنگی بین تیم های طراحی
- آماده شدن نقشه های سازه ای فونداسیون و اسکلت سازه و سقف تا تراز صفر
- فاز دو طراحی در دیسپلین های معماری، سازه، برق و مکانیک (در دست اقدام میباشد)

۴-۲-۳- طراحی سیستم زهکشی :

- انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار سیستم زهکشی
- نهایی شدن طراحی سیستم زهکشی
- اتمام عملیات زهکشی بخش شمالی و جنوبی

۴-۲-۴- طراحی سیستم ارتینگ :

- انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار سیستم ارتینگ.
- تا کنون نقشه ها، مشخصات فنی و محاسبات لازم بطور کامل به مدیریت طرح ارسال نگردیده است.
- شروع عملیات اجرائی در بخشهای شمالی و جنوبی.

۴-۲-۵- طراحی مرحله دوم و تفصیلی:

- در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ نقشه های تفصیلی ارائه گردید.



جدول شماره ۴ - گزارش پیشرفت وزنی عملیات طراحی و برنامه ریزی (درصد وزنی در کل پروژه معادل ۳ درصد)

الف) طراحی مرحله اول (۲۵ درصد)

W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	درصد پیشرفت فیزیکی
۲,۱,۱	نقشه برداری	کلی	۱	۱	۱۰۰	۵	۵
۲,۲,۲	مطالعات زمین شناسی	کلی	۱	۱	۱۰۰	۵	۵
۲,۲,۳	نقشه های اولیه معماری	کلی	۱	۰,۹۵	۹۵	۴۰	۳۸
۲,۲,۴	مطالعات اولیه سازه	کلی	۱	۰,۹۵	۹۵	۳۰	۲۸,۵
۲,۲,۵	هماهنگی سازه و معماری	کلی	۱	۰,۹۵	۹۵	۲۰	۱۹

ب) برنامه ریزی و مجوزها (۵ درصد)

W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	درصد پیشرفت فیزیکی
۲,۲,۱	برنامه زمانبندی کلی	کلی	۱	۰,۹۵	۹۵	۲۰	۱۹
۲,۲,۲	پوشش های بیمه ای پروژه	کلی	۱	۰,۵	۵۰	۸۰	۴۰

پ) طراحی مرحله دوم (۵۰ درصد)


W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	درصد پیشرفت فیزیکی
۲,۳,۱	نقشه های مرحله دوم معماری	کلی	۱	۰,۸۵	۸۵	۳۰	۲۵,۵
۲,۳,۲	نقشه های مرحله دوم سازه	کلی	۱	۰,۸۵	۸۵	۲۵	۲۱,۲۵
۲,۳,۳	نقشه های مرحله دوم مکانیک	کلی	۱	۰,۷۵	۷۵	۲۰	۱۵
۲,۳,۴	نقشه های مرحله دوم برق	کلی	۱	۰,۷۵	۷۵	۱۵	۱۱,۲۵



جدول شماره ۴ - گزارش پیشرفت وزنی عملیات طراحی و برنامه ریزی (درصد وزنی در کل پروژه معادل ۳ درصد)							
W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	درصد پیشرفت فیزیکی
۲,۳,۵	هماهنگی بین دیسپلینها و نهایی شدن مرحله دوم	کلی	۱	۰	۰	۱۰	۰
ت) طراحی تفصیلی (۲۰ درصد)							
۲,۴,۱	نقشه های تفصیلی معماری	کلی	۱	۰	۰	۳۰	۰
۲,۴,۲	نقشه های تفصیلی سازه	کلی	۱	۰	۰	۲۰	۰
۲,۴,۳	نقشه های معماری داخلی	کلی	۱	۰	۰	۲۵	۰
۲,۴,۴	نقشه های تفصیلی مکانیک	کلی	۱	۰	۰	۱۵	۰
۲,۴,۵	نقشه های تفصیلی برق	کلی	۱	۰	۰	۱۰	۰
۲۳,۸۸	جمع کل پیشرفت طراحی مرحله اول						
۲,۹۵	جمع کل پیشرفت برنامه ریزی و مجوزها						
۳۶,۵	جمع کل طراحی مرحله دوم						
۰	جمع کل طراحی تفصیلی						
۱,۹ درصد	جمع کل پیشرفت فیزیکی عملیات طراحی و برنامه ریزی						
۳ درصد	پیشرفت فیزیکی مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلی در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲						
۱/۱- درصد	وضعیت تقدم (+) و یا تاخر (-) عملیات اجرایی نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلی						



نمودار پیشرفت ستونی عملیات طراحی و برنامه ریزی

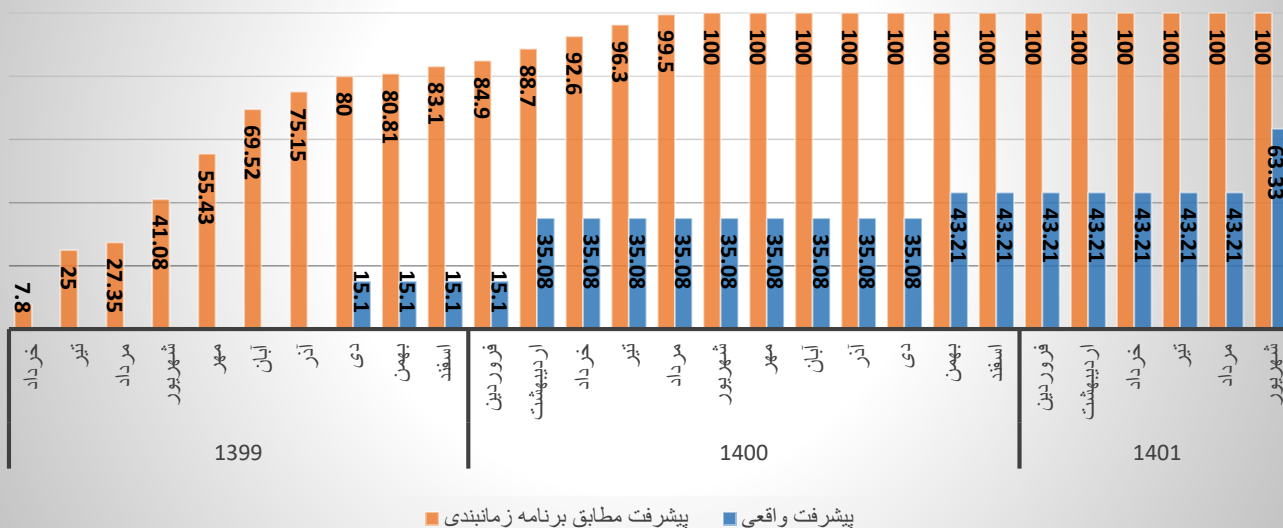

۳- عملیات ساخت:

۳-۱- عملیات خاکبرداری:

۳-۱-۱- عملیات گودبرداری:

نظر به اینکه مطابق طرح اولیه ساختمان موضوع قرارداد مشتمل بر هفت طبقه منفی جهت تامین پارکینگهای مورد نیاز میباشد، نیاز به گودبرداری از سطح زمین به عمق بین ۲۴ تا ۳۰ متر الزامی بوده که حجم عملیات خاکبرداری حدود ۱۶۲,۰۰۰ متر مکعب با استفاده از ماشین آلات زیر و توضیحات تکمیلی، توسط شریک محترم صورت پذیرفته است:

- بیل مکانیکی از یک تا چهار دستگاه با توجه به نیاز
- پیکور دو دستگاه در مقاطع مورد نیاز
- لودر یک دستگاه
- بولدوزر به صورت مقطعی یک دستگاه
- کمپرسی بین ۱۰ تا ۳۵ دستگاه در روز و بسته به میزان مورد نیاز که در مجموع با توجه به آمار اخذ شده از نگرهبانی کارگاه، تعداد ۱۶۱۵۶ سرویس خاک از پروژه به بیرون حمل گردیده است.
- بیل بوم بلند و جرثقیل بوم خشک از هر کدام یک دستگاه که در دو ماه انتهای عملیات جهت جمع آوری رمپ مورد استفاده قرار گرفته شد.
- عملیات گود برداری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ از بخش شمالی زمین شروع گردیده است.
- عملیات برچیدن رمپ در انتهای ضلع جنوبی و اتمام گودبرداری کامل پروژه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ به اتمام رسید.

۳-۱-۲. عملیات پایدار سازی:



سیستم پایدار سازی دیوارهای گودبرداری به صورت نیلینگ در محلهای مجاز و چاه برلنی در مجاورت ساختمانهای همسایه طراحی گردیده که در مجموع در کل پروژه جهت پایدار سازی دیواره های گودبرداری، به تعداد ۱۴۱۳ گمانه به طول ۲۴۴۴۲ متر طول حفاری، استرنند گذاری و تزریق گردیده و جمعاً ۱۰۰۲۸ متر مربع مش گذاری و شاتکریت صورت پذیرفته است.

- دریل واگن از دو تا سه دستگاه با توجه به نیاز.
- کمپرستور از دو تا چهار دستگاه با توجه به نیاز.
- از تعداد ۱۴۱۳ عدد گمانه احداث شده، بر روی تعداد ۱۱۷۱ گمانه عملیات تست کشش صورت پذیرفته که نتایج حاصله مورد تایید بودند.
- تعداد کل ستونهای برلنی معادل ۳۲ عدد که ۲۴ عدد از آنها در مجاورت برج ستاره صورت پذیرفته است و ارتفاع آنها از تراز زیر فونداسیون برج ستاره تا چهار متر زیر فونداسیون برج دنیز و به میزان کل ۵۳۵ متر طول صورت پذیرفته است.
- عملیات پایدار سازی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ از محل قسمت شمالی شروع گردید.
- عملیات پایدار سازی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ در محل برچیدن رمپ ورودی گود به اتمام رسید.


جدول شماره ۵ - گزارش پیشرفت وزنی عملیات گود برداری و تحکیم (درصد وزنی در کل پروژه معادل ۷.۵ درصد)							
الف) پارت شمالی (۶۵ درصد)							
W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	درصد پیشرفت فیزیکی
۴,۱,۱,۲	دیو و حمل خاک	M ^۳	۸۶۸۶۷	۸۶۸۶۷	۱۰۰	۲۰	۲۰
۴,۱,۱,۳	پایدار سازی دیواره شمالی	M ^۲	۲۰۶۷	۲۰۶۷	۱۰۰	۲۰	۲۰
۴,۱,۱,۴	پایدار سازی دیواره شرقی	M ^۲	۲۶۸۳	۲۶۸۳	۱۰۰	۴۰	۴۰
۴,۱,۱,۶	خاکبرداری کنار ملک ۱۴ چاه	M ^۳	۱۲۵۰۰	۱۲۵۰۰	۱۰۰	۱	۱
۴,۱,۱,۷	پایدار سازی بخش شمالی ضلع غربی	M ^۲	۵۴۸	۵۴۸	۱۰۰	۵	۵
۴,۱,۱,۸	۱۴ چاه برلنی شمالی	عدد	۱۴	۱۴	۱۰۰	۵	۵
۴,۱,۱,۹	پایدار سازی ۱۴ چاه برلنی	M ^۲	۵۸۴	۵۸۴	۱۰۰	۹	۹
ب) پارت جنوبی (۳۵ درصد)							



جدول شماره ۵ - گزارش پیشرفت وزنی عملیات گود برداری و تحکیم (درصد وزنی در کل پروژه معادل ۷,۵ درصد)

W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	درصد پیشرفت فیزیکی
۴,۲,۱,۱	دپو و حمل خاک	M ^۳	۲۹۶۶۷	۲۹۶۶۷	۱۰۰	۱۷	۱۷
۴,۲,۱,۲	خاکبرداری کنار ملک ۱۷ چاه	M ^۳	۱۳۸۵۰	۱۳۸۵۰	۱۰۰	۳	۳
۴,۲,۱,۳	اجرای ۱۷ چاه برلنی	عدد	۱۷	۱۷	۱۰۰	۹	۹
۴,۲,۱,۴	پایدار سازی ۱۷ چاه برلنی	M ^۲	۶۵۰	۶۵۰	۱۰۰	۱۹	۱۹
۴,۲,۱,۵	پایدار سازی بخش جنوبی	M ^۲	۸۱۴	۸۱۴	۱۰۰	۹	۹
۴,۲,۱,۶	برچیدن رمپ	M ^۳	۲۲۰۱۹	۲۲۰۱۹	۱۰۰	۹	۹
۴,۲,۱,۷	پایدار سازی ضلع شرقی	M ^۲	۱۹۶۲	۱۹۶۲	۱۰۰	۱۴	۱۴
۴,۲,۱,۸	پایدار سازی ضلع جنوبی	M ^۲	۷۵۲	۷۵۲	۱۰۰	۱۷	۱۷
۴,۲,۱,۹	برچیدن کارگاه پایدار سازی	کلی	۱	۱	۱۰۰	۳	۳
۶۵	جمع کل پیشرفت پارت شمالی						
۳۵	جمع کل پیشرفت پارت جنوبی						
۷/۵۰ درصد	جمع کل پیشرفت فیزیکی عملیات گود برداری و تحکیم						
۷/۵۰ درصد	پیشرفت فیزیکی مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلی در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲						
۰/۰۰	وضعیت تقدم (+) و یا تاخر (-) عملیات اجرایی نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلی						

نمودار ستونی پیشرفت گودبرداری و تحکیم

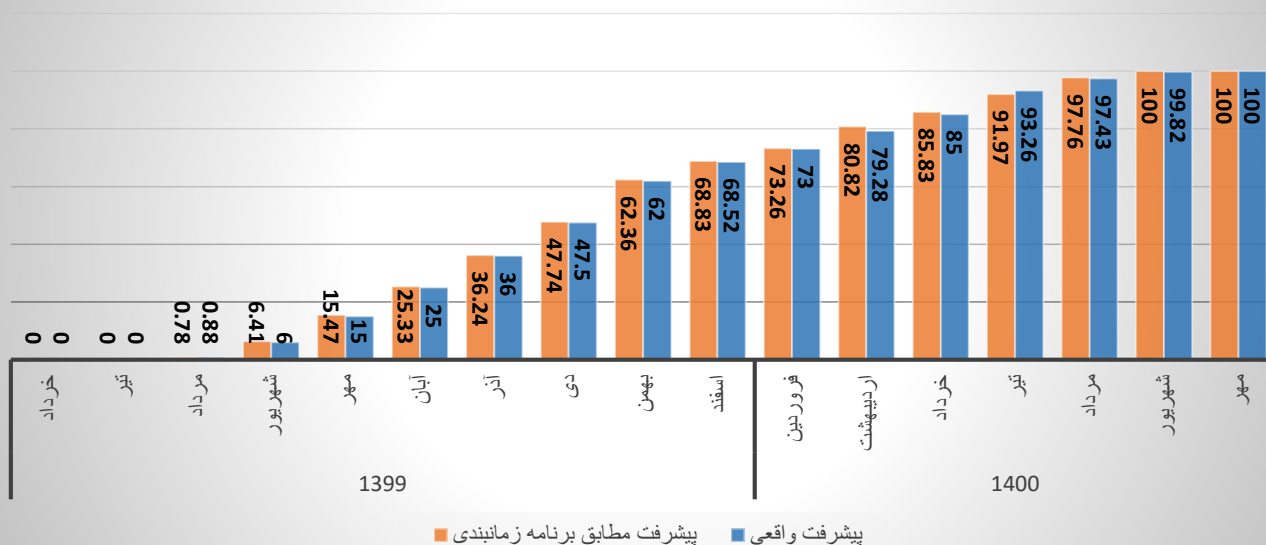

۲-۳- عملیات بستر سازی و فونداسیون:

۲-۳-۱. عملیات یستر سازی محل گودبرداری:

با توجه به عمق خاکبرداری و امکان برخورد با سطح آب زیر زمینی، لزوم احداث سیستم زهکشی زیر فونداسیون و همچنین عایقکاری دیوارهای جانبی با توجه به توضیحات تکمیلی زیر الزامی بوده که در این راستا جمعاً به میزان ۷۴۷ متر طول کانال زهکشی زیر فونداسیون احداث گردیده و جهت عایقکاری دیوارهای پیرامونی، نیز نیاز به تهیه و نصب مقدار ۱۰۰۲۸ متر مربع ژئوممبران میباشد.

- عملیات احداث سیستم زهکشی و عایقکاری از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ در قسمت شمالی شروع گردید.
- عملیات اجرایی شامل نصب دیمپلر شیت، اجرای شبکه کانالهای زهکشی، اجرای بستر سازی با استفاده از لایه فیلتر و بتن مگر کف گود، احداث بتن مگر اول با عیار ۲۰۰ گیلوگرم سیمن، اجرای لایه ژئوممبران در کف و دیواره ها و نهایتاً اجرای بتن مگر دوم با عیار ۲۰۰ کیلو گرم سیمن بوده است.
- عملیات زهکشی و عایقکاری بستر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ به اتمام رسید ولی عملیات عایقکاری دیوارها متناسب با احداث دیوار حائل اطراف سازه در دست اجرا میباشد که با اتمام عملیات احداث دیوار حائل، عملیات عایقکاری نیز به اتمام خواهد رسید.

۲-۳-۲. عملیات اجرای فونداسیون:

- عملیات اجرای فونداسیون در قسمت شمالی و به مساحت ۳۶۴۷ متر مربع در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ شروع گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ به اتمام رسید.
- عملیات اجرای فونداسیون در قسمت جنوبی و به مساحت ۲۴۲۸ متر مربع در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ شروع گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ به اتمام رسید.



جدول شماره ۶ - گزارش پیشرفت وزنی سیستم زهکشی و فونداسیون ساختمان (درصد وزنی در کل پروژه معادل ۳,۷۵)

الف) پارت شمالی (۶۰ درصد)

W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	پیشرفت فیزیکی
۴,۲,۱,۱	اجرای زهکش کف	M	۴۴۸	۴۴۸	۱۰۰	۱۵	۱۵
۴,۲,۱,۲	اجرای چاه آسانسورهای ۱ تا ۳	عدد	۳	۳	۱۰۰	۵	۵
۴,۲,۱,۳	اجرای فونداسیون	M ^۲	۳۶۴۶,۵	۳۶۴۶,۵	۱۰۰	۷۰	۷۰
۴,۲,۱,۴	نصب تاور کرین و آلیماک	عدد	۲	۲	۱۰۰	۱۰	۱۰

ب) پارت جنوبی (۴۰ درصد)

W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	پیشرفت فیزیکی
۴,۲,۱,۱	اجرای زهکش کف	M	۲۹۹	۲۹۹	۱۰۰	۱۵	۱۵
۴,۲,۱,۲	اجرای چاه آسانسورهای ۴ و ۵	عدد	۲	۲	۱۰۰	۵	۵
۴,۲,۱,۳	اجرای فونداسیون	M ^۲	۲۴۲۷,۶۴	۲۴۲۷,۶۴	۱۰۰	۷۰	۷۰
۴,۲,۱,۴	نصب تاور کرین دوم و سوم	عدد	۲	۲	۱۰۰	۱۰	۱۰

۶۰

جمع کل پیشرفت پارت شمالی

۴۰

جمع کل پیشرفت پارت جنوبی

۳,۷۵

جمع کل پیشرفت فیزیکی سیستم زهکشی و فونداسیون ساختمان

۳,۷۵


پیشرفت فیزیکی مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلی در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲

۰

وضعیت تقدم (+) و یا تاخر (-) عملیات اجرایی نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلی



نمودار ستونی پیشرفت عملیات زهکشی و فونداسیون

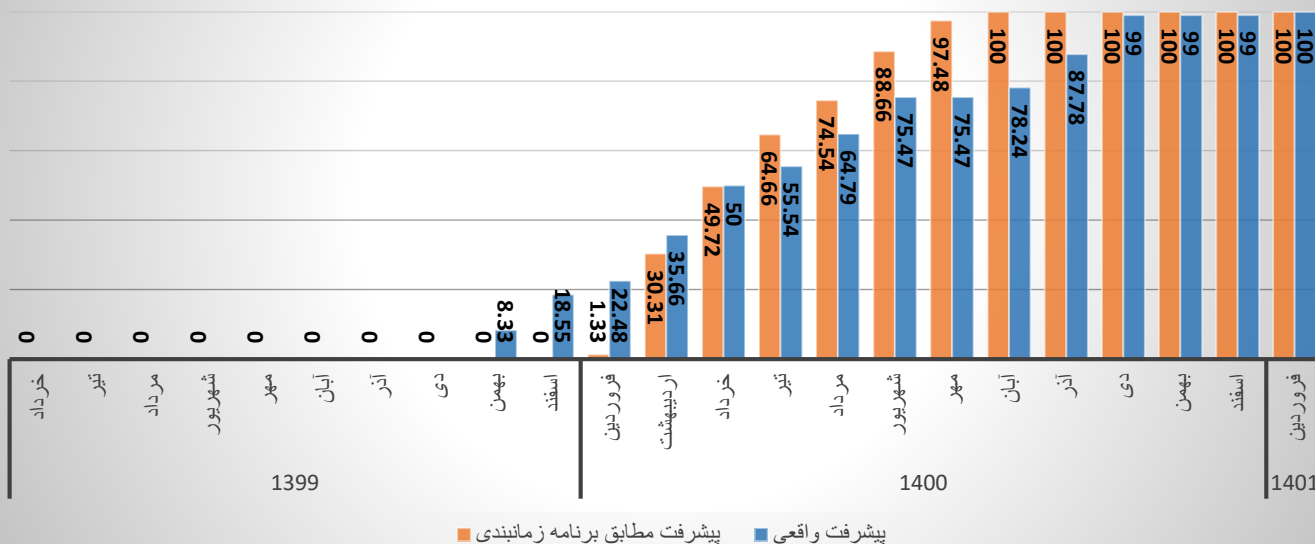

۴-۲- عملیات اجرای سازه اسکلت بتنی و سقفهای طبقات زیر زمینی:

سازه اسکلت فلزی شامل دیوارهای حائل تا تراز زمین طبیعی، دیوارهای برشی، ستونها و نهایتا سیستم سقف به شرح زیر میباشد که در این راستا اقدامات و تجهیزاتی زیر در محل پروژه مستقر گردیده است:

- تامین محل سکونت کارگران در جنب کارگاه به ظرفیت ۸۰ نفر که در حال حاضر حدود ۱۰۰ نفر از فضای فوق استفاده مینمایند.
- تامین تعداد چهار دستگاه خم کن هیدرولیکی.
- تامین دو دستگاه برش هیدرولیکی آرماتور.
- تامین دو دستگاه خاموت زن.
- تامین سه دستگاه رزوه زن آرماتور جهت اجرای اتصالات مکانیکی.
- تامین قالبهای یکپارچه فلزی جهت اجرای دیوارهای حائل.
- تامین قالبهای فلزی یکپارچه جهت اجرای ستونها.
- عملیات اجرای دیوارهای حائل و برشی، ستونها و سقف طبقه ۷- در قسمت شمالی و به مساحت ۳۶۴۷ متر مربع در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ شروع گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ به اتمام رسید.
- عملیات اجرای دیوارهای حائل و برشی، ستونها و سقف طبقه ۶- در قسمت شمالی و به مساحت ۳۶۴۷ متر مربع در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ شروع گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ به اتمام رسید.
- عملیات اجرای دیوارهای حائل و برشی، ستونها و سقف طبقه ۵- در قسمت شمالی و به مساحت ۳۶۴۷ متر مربع در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ شروع گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ به اتمام رسید.
- عملیات اجرای دیوارهای حائل و برشی، ستونها و سقف طبقه ۴- در قسمت شمالی و به مساحت ۳۶۴۷ متر مربع در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ شروع گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ به اتمام رسید.



- عملیات اجرای دیوارهای حائل و برشی، ستونها و سقف طبقه ۳- در قسمت شمالی و به مساحت ۳۶۴۷ متر مربع در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ شروع گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ به اتمام رسید.
- عملیات اجرای دیوارهای حائل و برشی، ستونها و سقف طبقه ۲- در قسمت شمالی و به مساحت ۳۶۴۷ متر مربع در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ شروع گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ به اتمام رسید.
- عملیات اجرای دیوارهای حائل و برشی، ستونها و سقف طبقه ۱- در قسمت شمالی و به مساحت ۳۶۴۷ متر مربع در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ شروع گردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ به اتمام رسید.
- عملیات اجرای دیوارهای حائل و برشی، ستونها و سقف طبقه ۷- در قسمت جنوبی و به مساحت ۲۴۲۸ متر مربع در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ شروع گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ به اتمام رسید.
- عملیات اجرای دیوارهای حائل و برشی، ستونها و سقف طبقه ۶- در قسمت جنوبی و به مساحت ۲۴۲۸ متر مربع در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ شروع گردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ به اتمام رسید.
- عملیات اجرای دیوارهای حائل و برشی، ستونها و سقف طبقه ۵- در قسمت جنوبی و به مساحت ۲۴۲۸ متر مربع در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ شروع گردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ به اتمام رسید.
- عملیات اجرای دیوارهای حائل و برشی، ستونها و سقف طبقه ۴- در قسمت جنوبی و به مساحت ۲۴۲۸ متر مربع در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ شروع گردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ به اتمام رسید.
- عملیات اجرای دیوارهای حائل و برشی، ستونها و سقف طبقه ۳- در قسمت جنوبی و به مساحت ۲۴۲۸ متر مربع در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شروع گردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ به اتمام رسید.
- عملیات اجرای دیوارهای حائل و برشی، ستونها و سقف طبقه ۲- در قسمت جنوبی و به مساحت ۲۴۲۸ متر مربع در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شروع گردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ به اتمام رسید.
- عملیات اجرای دیوارهای حائل و برشی، ستونها و سقف طبقه ۱- در قسمت جنوبی و به مساحت ۲۱۸۴ متر مربع در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شروع گردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ به اتمام رسید.
- عملیات اجرایی ساخت رمپ تجاری در طبقه ۱- به همکف در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ شروع و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ به اتمام رسید.



جدول شماره ۷ - گزارش پیشرفت وزنی عملیات اجرای اسکلت سازه بتنی و سقفهای زیر زمینی (درصد وزنی در کل پروژه معادل ۴,۵ درصد میباشد)

الف) پارت شمالی (۶۰ درصد)

W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	پیشرفت فیزیکی
۴,۳,۱,۱	طبقه منفی هفت شمالی	M ²	۳۶۴۶/۵	۳۶۴۶/۵	۱۰۰	۱۵	۱۵
۴,۳,۱,۲	طبقه منفی شش شمالی	M ²	۳۶۴۶/۵	۳۶۴۶/۵	۱۰۰	۱۵	۱۵
۴,۳,۱,۳	طبقه منفی پنج شمالی	M ²	۳۶۴۶/۵	۳۶۴۶/۵	۱۰۰	۱۵	۱۵
۴,۳,۱,۴	طبقه منفی چهار شمالی	M ²	۳۶۴۶/۵	۳۶۴۶/۵	۱۰۰	۱۵	۱۵
۴,۳,۱,۵	طبقه منفی سه شمالی	M ²	۳۶۴۶/۵	۳۶۴۶/۵	۱۰۰	۱۴	۱۴
۴,۳,۱,۶	طبقه منفی دو شمالی	M ²	۳۶۴۶/۵	۳۶۴۶/۵	۱۰۰	۱۳	۱۳
۴,۳,۱,۷	طبقه منفی یک شمالی	M ²	۳۶۴۶/۵	۳۶۴۶/۵	۱۰۰	۱۳	۱۳

ب) پارت جنوبی (۴۰ درصد)

W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	پیشرفت فیزیکی
۴,۳,۲,۱	طبقه منفی هفت جنوبی	M ²	۲۴۲۷/۶۴	۲۴۲۷/۶۴	۱۰۰	۱۵	۱۵
۴,۳,۲,۲	طبقه منفی شش جنوبی	M ²	۲۴۲۷/۶۴	۲۴۲۷/۶۴	۱۰۰	۱۵	۱۵
۴,۳,۲,۳	طبقه منفی پنج جنوبی	M ²	۲۴۲۷/۶۴	۲۴۲۷/۶۴	۱۰۰	۱۵	۱۵
۴,۳,۲,۴	طبقه منفی چهار جنوبی	M ²	۲۴۲۷/۶۴	۲۴۲۷/۶۴	۱۰۰	۱۵	۱۰۰
۴,۳,۲,۵	طبقه منفی سه جنوبی	M ²	۲۴۲۷/۶۴	۲۴۲۷/۶۴	۱۰۰	۱۴	۱۴
۴,۳,۲,۶	طبقه منفی دو جنوبی	M ²	۲۴۲۷/۶۴	۲۴۲۷/۶۴	۱۰۰	۱۳	۱۳
۴,۳,۲,۷	طبقه منفی یک جنوبی	M ²	۲۴۲۷/۶۴	۲۴۲۷/۶۴	۱۰۰	۱۳	۱۳

جمع کل پیشرفت پارت شمالی

۶۰

جمع کل پیشرفت پارت جنوبی

۴۰

جمع کل پیشرفت فیزیکی عملیات اجرای اسکلت سازه بتنی و سقفهای زیر زمینی

۴/۵

پیشرفت فیزیکی مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلی در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲


۴/۵

وضعیت تقدم (+) و یا تاخر (-) عملیات اجرایی نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلی

-۰/۰



نمودار ستونی پیشرفت عملیات اجرای اسکلت سازه بتنی و سقف های زیر زمینی

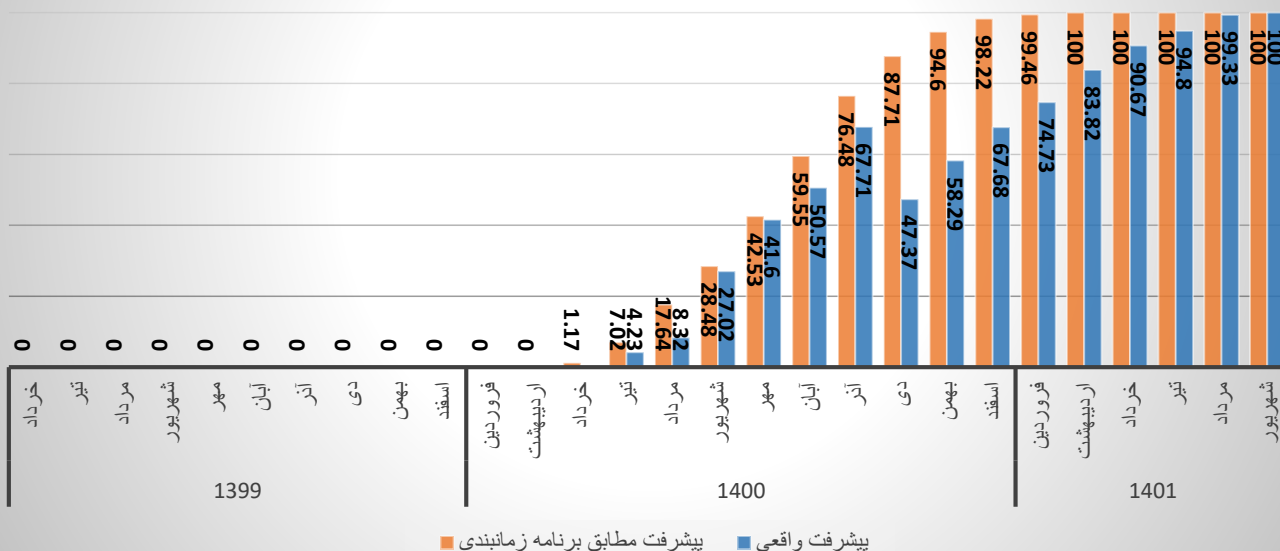

عملیات اجرای سازه اسکلت بتنی و سقفهای طبقات روی زمینی:

- عملیات اجرای ستونها و سقف طبقه همکف در قسمت شمالی و به مساحت ۳۵۰۶ متر مربع در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ شروع گردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ به اتمام رسید.
- عملیات اجرای ستونها و سقف طبقه مزانین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱ آغاز گردید و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ به پایان رسید.
- عملیات اجرای ستونها و سقف طبقه اول تجاری به مساحت ۱۱۳۳ متر مربع از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ آغاز گردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ به اتمام رسید.
- عملیات اجرای ستونها و سقف طبقه دوم تجاری به مساحت ۱۱۳۳ متر مربع از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ آغاز گردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ به اتمام رسید.
- عملیات اجرای ستونها و سقف طبقه اول شمالی به مساحت ۲۰۸۶ متر مربع در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شروع گردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به اتمام رسید.
- عملیات ستونها و سقف طبقه دوم شمالی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ به مساحت ۲۰۳۵ متر مربع شروع گردیده و تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ به اتمام رسید.



- عملیات ستونها و سقف طبقه سوم شمالی به مساحت ۲۰۳۵ متر مربع از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ شروع گردید و تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ به اتمام رسید.
- عملیات ستونها و سقف طبقه چهارم شمالی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع شروع گردید و تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ادامه دارد.
- عملیات ستونها و سقف طبقه پنجم شمالی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ به مساحت ۵۰۰ متر مربع شروع گردید و تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ادامه دارد.
-
- عملیات ستونها و سقف طبقه مزانین جنوبی به مساحت ۱۶۸۸ متر مربع از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ شروع گردیده و تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به اتمام رسید.
- عملیات ستونها و سقف طبقه اول جنوبی به مساحت ۱۶۸۸ متر مربع از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ شروع گردید و تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ به اتمام رسید.
- عملیات ستونها و سقف طبقه دوم جنوبی به مساحت ۸۰۰ متر مربع در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ شروع گردیده و تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ادامه دارد.
- عملیات ستونها و سقف طبقه سوم جنوبی به مساحت ۱۰۰ متر مربع در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ شروع گردیده و تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ادامه دارد.
-




جدول شماره ۸ - گزارش پیشرفت وزنی عملیات اجرای اسکلت سازه بتنی و سقفهای رو زمینی (درصد وزنی در کل پروژه معادل ۱۰,۵ درصد میباشد)							
الف) پارت شمالی (۶۰ درصد)							
W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	درصد پیشرفت فیزیکی
۴,۴,۱,۱	طبقه همکف	M ^۲	۳۵۰۶	۳۵۰۶	۱۰۰	۴	۴
۴,۴,۱,۲	طبقه مزانین	M ^۲	۵۰۷	۵۰۷	۱۰۰	۲	۲
۴,۴,۱,۳	طبقه اول	M ^۲	۲۰۸۶	۲۰۸۶	۱۰۰	۴	۴
۴,۴,۱,۴	طبقه دوم	M ^۲	۲۰۳۵	۲۰۳۵	۱۰۰	۴	۴
۴,۴,۱,۵	طبقه سوم	M ^۲	۲۰۳۵	۲۰۳۵	۱۰۰	۴	۴
۴,۴,۱,۶	طبقه چهارم	M ^۲	۲۰۳۵	۱۶۰۰	۷۸,۶۲	۴	۳,۱۴
۴,۴,۱,۷	طبقه پنجم	M ^۲	۲۰۳۵	۵۰۰	۲۴,۵۷	۴	۰,۹۸
ب) پارت جنوبی (۴۰ درصد)							
۴,۴,۲,۱	طبقه همکف	M ^۲	۲۲۶۶	۲۲۶۶	۱۰۰	۴	۴
۴,۴,۲,۲	طبقه مزانین	M ^۲	۱۶۸۸	۱۶۸۸	۱۰۰	۲	۲
۴,۴,۲,۳	طبقه اول	M ^۲	۱۶۸۸	۱۶۸۸	۱۰۰	۴	۴
۴,۴,۲,۴	طبقه دوم	M ^۲	۱۶۴۷	۸۰۰	۴۸,۵۷	۴	۱,۹۴
۴,۴,۲,۵	طبقه سوم	M ^۲	۱۶۴۷	۱۰۰	۶,۰۷	۴	۰,۲۴



W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	پیشرفت فیزیکی
	جمع کل پیشرفت پارت شمالی						۱۳,۲۸
	جمع کل پیشرفت پارت جنوبی						۴,۸۷۴
	جمع کل پیشرفت فیزیکی عملیات اجرای اسکلت سازه بتنی و سقفهای زیر زمینی						۱,۹۱
	پیشرفت فیزیکی مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلی در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲						۸,۰۸۵
	وضعیت تقدم (+) و یا تاخر (-) عملیات اجرایی نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلی						-۶,۱۷۴

نمودار پیشرفت سقف های رو زمینی

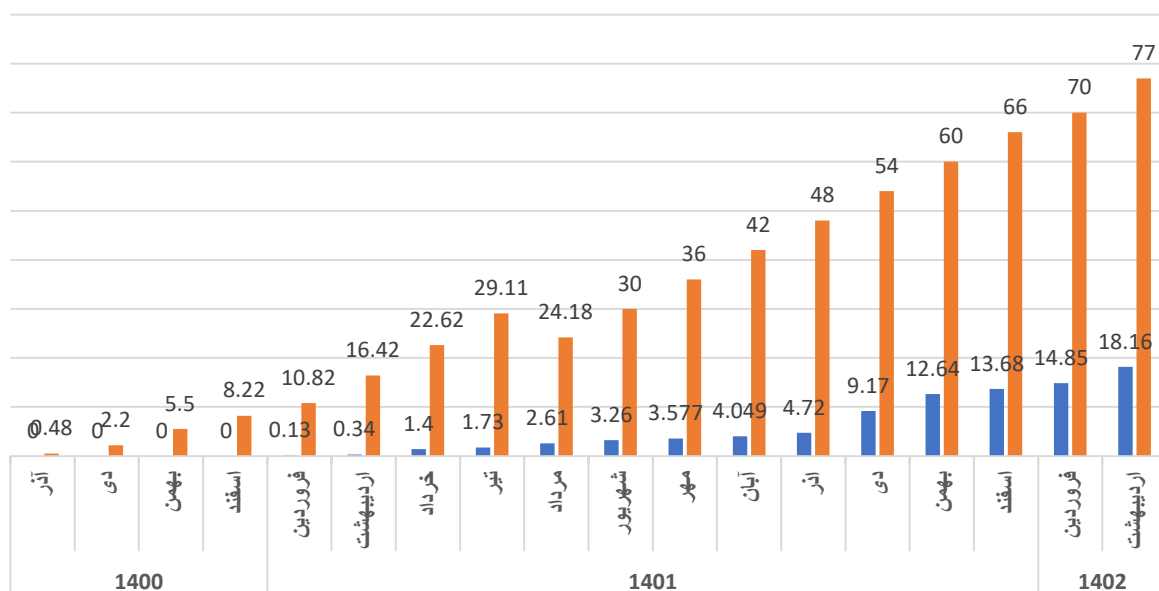

۵-۲ - عملیات تاسیسات مکانیکی:



- عمده عملیات تاسیسات مکانیکی صورت پذیرفته تا کنون فقط شامل اسلیو گذاری محل عبور لوله های تاسیسات مکانیکی در سقفهای بتنی میباشد.
- شروع لوله های تخلیه فاضلاب در طبقه ۷- و ۶- و ۵- و ۴- و ۳- و ۲- و ۱- بلوک شمالی.
- شروع لوله های تخلیه فاضلاب در طبقه ۷- و ۶- و ۵- و ۴- و ۳- و ۲- و ۱- بلوک جنوبی.
- شروع نصب کانالهای هواکش در طبقه ۶- و ۵- و ۴- شمالی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
- تهیه و حمل لوله های گاز و اطفای حریق
- شروع عملیات اجرای لوله های اطفای حریق




جدول شماره ۷ - گزارش وضعیت پیشرفت وزنی عملیات اجرای تاسیسات مکانیکی (درصد وزنی در کل پروژه معادل ۱۱,۲۵ درصد میباشد)

الف) پارت شمالی (۶۰ درصد)

W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	پیشرفت فیزیکی
۴,۵,۱,۱	لوله های فاضلاب	درصد	۱۰۰	۴۰	۴۰	۱۷	۶,۸
۴,۵,۱,۲	لوله های آب مصرفی	درصد	۱۰۰	۱۰	۱۰	۲۴	۲,۴
۴,۵,۱,۳	لوله های سرمایش و گرمایش	درصد	۱۰۰	۲۰	۲۰	۱۸	۳,۶
۴,۵,۱,۴	لوله های گاز شهری	درصد	۱۰۰	۰	۰	۱۲	۰
۴,۵,۱,۵	لوله های اطفای حریق	درصد	۱۰۰	۳۰	۳۰	۱۲	۳,۶
۴,۵,۱,۶	لوله های اگزاست	درصد	۱۰۰	۱۵	۱۵	۱۷	۲,۵۵
ب) پارت جنوبی (۴۰ درصد)							
۴,۵,۱,۱	لوله های فاضلاب	درصد	۱۰۰	۴۰	۴۰	۱۷	۶,۸
۴,۵,۱,۲	لوله های آب مصرفی	درصد	۱۰۰	۱۰	۱۰	۲۴	۲,۴
۴,۵,۱,۳	لوله های سرمایش و گرمایش	درصد	۱۰۰	۲۰	۲۰	۱۸	۳,۶
۴,۵,۱,۴	لوله های اطفای حریق	درصد	۱۰۰	۳۰	۳۰	۱۲	۳,۶
۴,۵,۱,۵	لوله های اگزاست	درصد	۱۰۰	۱۵	۱۵	۱۲	۱,۸
۴,۵,۱,۶	لوله های گاز	درصد	۱۰۰		۰	۱۷	۰
۱۱,۳۷	جمع کل پیشرفت پارت شمالی						
۷,۶۸	جمع کل پیشرفت پارت جنوبی						
۲,۱۴	جمع کل پیشرفت فیزیکی عملیات اجرای تاسیسات مکانیکی						
۶,۶۸	پیشرفت فیزیکی مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلی در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲						
-۴,۵۴	وضعیت تقدم (+) و یا تاخر (-) عملیات اجرایی نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلی						



گزارش وضعیت پیشرفت عملیات تاسیسات مکانیکی

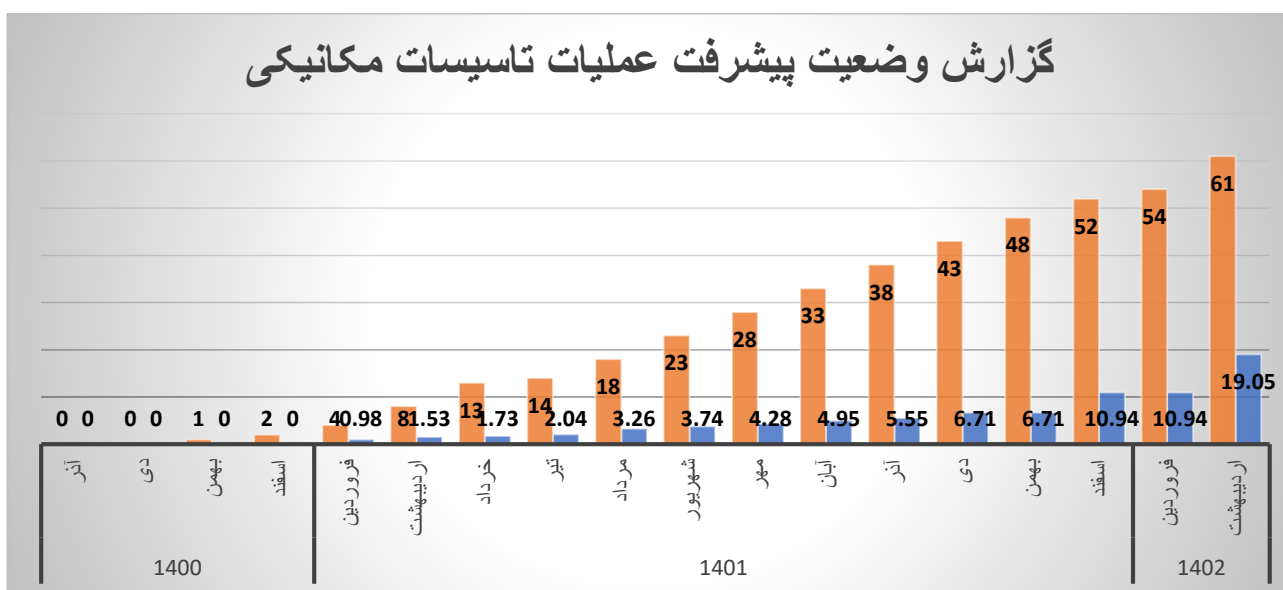

۲-۶- عملیات تاسیسات برقی:


- شروع اسلیو گذاری با لوله های پی وی سی در طبقات منفی پارت شمالی
- لوله کشی برق پی وی سی در انبارهای طبقات ۶- و ۵- و ۴- و ۳- و ۲- و ۱- پارت شمالی و جنوبی.
- سیم کشی برق انبارهای طبقات ۶- و ۵- و ۴- و ۳- و ۲- پارت شمالی و جنوبی.
- خرید و حمل بخشی از سیم های افشان، کابل های برق و لوله های پی وی سی



جدول شماره ۱۰ - گزارش پیشرفت وزنی عملیات اجرای تاسیسات برقی (درصد وزنی در کل پروژه معادل ۶ درصد)							
الف) پارت شمالی (۶۰ درصد)							
درصد پیشرفت فیزیکی	درصد وزنی	درصد انجام شده	مقدار انجام شده	مقدار کل	واحد	شرح عملیات	W.B.S
۱۲,۵	۵۰	۲۵	۲۵	۱۰۰	درصد	کابل‌های برق	۴,۶,۱,۱
۷,۵	۲۵	۳۰	۳۰	۱۰۰	درصد	کابل‌های جریان ضعیف	۴,۶,۱,۲
۲,۵	۲۵	۱۰	۱۰	۱۰۰	درصد	تابلوهای داخل طبقات	۴,۶,۱,۳
ب) پارت جنوبی (۴۰ درصد)							
۱۲,۵	۵۰	۲۵	۲۵	۱۰۰	درصد	کابل‌های برق	۴,۶,۲,۱
۷,۵	۲۵	۳۰	۳۰	۱۰۰	درصد	کابل‌های جریان ضعیف	۴,۶,۲,۲
۲,۵	۲۵	۱۰	۱۰	۱۰۰	درصد	تابلوهای داخل طبقات	۴,۶,۲,۳
۱۳,۵	جمع کل پیشرفت پارت شمالی						
۹	جمع کل پیشرفت پارت جنوبی						
۱,۳۵	جمع کل پیشرفت فیزیکی عملیات اجرای تاسیسات برقی						
۳,۱۸	پیشرفت فیزیکی مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلی در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲						
-۱,۸۳	وضعیت تقدم (+) و یا تاخر (-) عملیات اجرایی نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلی						



گزارش پیشرفت عملیات تاسیسات برقی

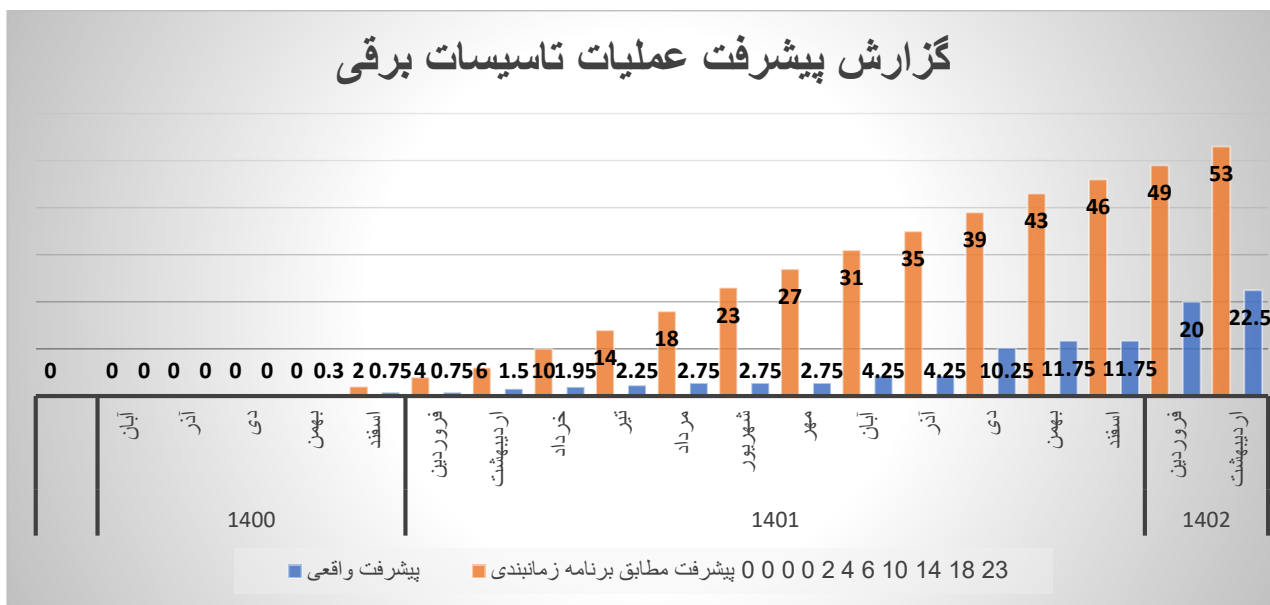

۷-۲- عملیات سفت کاری:

- عملیات تیغه چینی انبار در طبقه ۶- به تعداد ۵۷ انبار که عملیات فوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ شروع و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ به اتمام رسید.
- عملیات تیغه چینی انبار در طبقه ۵- به تعداد ۵۷ انبار که عملیات فوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ شروع و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ به اتمام رسید.
- عملیات تیغه چینی انبار در طبقه ۴- به تعداد ۵۷ انبار که عملیات فوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ شروع و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به اتمام رسید.
- عملیات تیغه چینی انبار در طبقه ۳- به تعداد ۵۷ انبار که عملیات فوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ شروع و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به اتمام رسید.
- عملیات تیغه چینی انبار در طبقه ۲- به تعداد ۵۷ انبار که عملیات فوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ شروع و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به اتمام رسید.
- شروع عملیات تیغه چینی انبار در طبقه ۱- در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ شروع گردید و تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ادامه دارد.
- تهیه و تامین سنگ گرانیات کفسازی طبقات منفی.
- عملیات تیغه چینی انبار در طبقه ۶- جنوبی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ به تعداد ۲۰ انبار شروع گردیده و تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ به اتمام رسید.
- عملیات تیغه چینی انبار در طبقه ۵- جنوبی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ به تعداد ۲۰ انبار شروع گردیده و تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ به اتمام رسید.
- عملیات تیغه چینی انبار در طبقه ۴- جنوبی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ به تعداد ۲۰ انبار شروع گردیده و تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ به اتمام رسید.
- اندود سیمانی طبقه ۶- و ۵- و ۴- جنوبی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ شروع گردید.



- اجرای عملیات اندود سیمانی انبار ها در طبقه ۶- که عملیات فوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ شروع و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ خاتمه یافته است.
- اجرای عملیات اندود سیمانی انبار ها در طبقه ۵- که عملیات فوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ شروع و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ خاتمه یافته است.
- اجرای عملیات اندود سیمانی انبار ها در طبقه ۴- که عملیات فوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ شروع و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ خاتمه یافته است.
- اجرای عملیات اندود سیمانی انبار ها در طبقه ۳- که عملیات فوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ شروع و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ به اتمام رسید.
- اجرای عملیات اندود سیمانی انبار ها در طبقه ۲- که عملیات فوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ شروع و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ به اتمام رسید.
- ساخت و نصب چهار چوب و درب انبار ها در طبقات ۱- و ۲-، ۳-، ۴-، ۵- و ۶- که عملیات فوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۸ شروع و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۰ به اتمام رسید.
- کفسازی انبار های در طبقات ۲- و ۱- بوسیله موزائیک که عملیات فوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ شروع و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ به اتمام رسید.
- شروع عملیات سفید کاری داخل انبارهای طبقات ۳- و ۲- و ۱- که عملیات فوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ شروع گردیده است.
- اجرای قرنیز پیاده رو ها در طبقه ۶- در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ شروع گردید و تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ به اتمام رسید.
- اجرای قرنیز پیاده رو ها در طبقه ۵- در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ شروع گردید و تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ به اتمام رسید.
- اجرای قرنیز پیاده رو ها در طبقه ۴- در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ شروع گردید و تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ به اتمام رسید.
- اجرای قرنیز پیاده رو ها در طبقه ۳- در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ شروع گردید و تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ به اتمام رسید.
- اجرای قرنیز پیاده رو ها در طبقه ۲- در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ شروع گردید و تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به اتمام رسید.
- اجرای قرنیز پیاده رو ها در طبقه ۱- در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ شروع گردید و تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به اتمام رسید.
- اجرای سنگ پیاده رو و کف طبقه ۶- شمالی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ شروع گردید و تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ به اتمام رسید.
- اجرای سنگ پیاده رو و کف طبقه ۵- شمالی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ شروع گردید و تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ به اتمام رسید.
- اجرای سنگ پیاده رو و کف طبقه ۴- شمالی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ شروع گردید و تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ به اتمام رسید.
- اجرای سنگ پیاده رو و کف طبقه ۳- شمالی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ شروع گردید و تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۰ به اتمام رسید.
- اجرای سنگ پیاده رو و کف طبقه ۲- شمالی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ شروع گردید و تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۰ به اتمام رسید.
- اجرای سنگ پیاده رو و کف طبقه ۶- جنوبی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ شروع گردید و تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ ادامه دارد.
- اجرای سنگ کف پارکینگ طبقه ۵- جنوبی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ شروع گردید و تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ ادامه دارد.
- اجرای سنگ کف پارکینگ طبقه ۴- جنوبی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ شروع گردید و تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ ادامه دارد.



اجرای سنگ کف پارکینگ طبقه ۳- جنوبی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ شروع گردید و تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ ادامه دارد
اجرای سنگ کف پارکینگ طبقه ۲- جنوبی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ شروع گردیده و تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ ادامه دارد
اجرای دیوار چینی انبار های طبقه ۷- شمالی و جنوبی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ شروع گردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۰ به اتمام رسید .


اجرای دیوار چینی طبقه اول شمالی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ شروع گردید و تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ادامه دارد .
اجرای چهار چوب های پنجره در واحد های شمالی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ شروع گردید و تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ادامه دارد .

جدول شماره ۱۱- گزارش پیشرفت وزنی عملیات سفت کاری (درصد وزنی در کل پروژه معادل ۱۳ درصد میباشد)							
الف) پارت شمالی (۶۰ درصد)							
W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	پیشرفت فیزیکی درصد
۴,۷,۱,۱	بلوکاز کف طبقه منفی هفت	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱	۱
۴,۷,۱,۲	تیغه چینی های طبقات زیر زمین	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵	۵
۴,۷,۱,۳	اندود سیمانی و نصب چهار چوب زیر زمین	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۳	۳
۴,۷,۱,۴	کفسازی طبقات زیر زمین	درصد	۱۰۰	۹۸	۹۸	۶	۵,۸۸
۴,۷,۱,۵	تیغه چینی طبقات رو زمین	درصد	۱۰۰	۵	۵	۳۵	۱,۷۵
۴,۷,۱,۶	اندود گچ و خاک و نصب چهارچوب طبقات	درصد	۱۰۰	۳	۳	۲۲	۶۶
۴,۷,۱,۷	کفسازی طبقات رو زمین	درصد	۱۰۰	۰	۰	۷	۰
۴,۷,۱,۸	زیر سازی سقف کاذب	درصد	۱۰۰	۰	۰	۲۱	۰
ب) پارت جنوبی (۴۰ درصد)							
۴,۷,۲,۱	بلوکاز کف طبقه منفی هفت	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱	۱
۴,۷,۲,۲	تیغه چینی های طبقات زیر زمین	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵	۵
۴,۷,۲,۳	اندود سیمانی و نصب چهار چوب زیر زمین	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۳	۳
۴,۷,۲,۴	کفسازی طبقات زیر زمین	درصد	۱۰۰	۹۸	۹۸	۶	۵,۸۸
۴,۷,۲,۵	تیغه چینی طبقات رو زمین	درصد	۱۰۰	۰	۰	۳۵	۰
۴,۷,۲,۶	اندود گچ و خاک و نصب چهارچوب طبقات	درصد	۱۰۰	۰	۰	۲۲	۰
۴,۷,۲,۷	کفسازی طبقات رو زمین	درصد	۱۰۰	۰	۰	۷	۰
۴,۷,۲,۸	زیر سازی سقف کاذب	درصد	۱۰۰	۰	۰	۲۱	۰
۱۰,۳۷	جمع کل پیشرفت پارت شمالی						
۵,۹۵۲	جمع کل پیشرفت پارت جنوبی						
۲,۱۲	جمع کل پیشرفت فیزیکی عملیات اجرای عملیات سفت کاری						



۸,۴۵	پیشرفت فیزیکی مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلی در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲
-۶,۳۲۸	وضعیت تقدم (+) و یا تاخر (-) عملیات اجرایی نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلی

نمودار پیشرفت عملیات سفت کاری

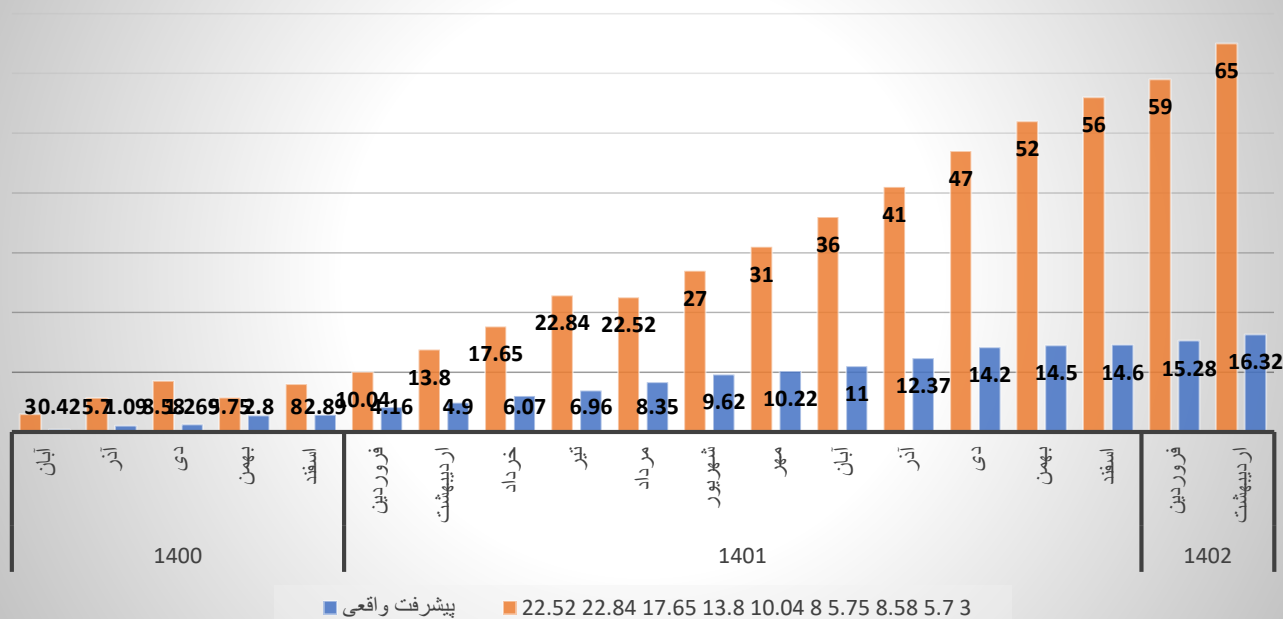




عملیات نازک کاری

جدول شماره ۱۲- گزارش وضعیت پیشرفت وزنی عملیات نازک کاری (درصد وزنی در کل پروژه معادل ۶ درصد میباشد)

الف) پارت شمالی (۶۰ درصد)							
W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	پیشرفت فیزیکی درصد
۴,۸,۱,۱	اندود نهایی دیوارهای زیر زمین	درصد	۱۰۰	60	۶۰	۷	۴,۲
۴,۸,۱,۲	کفسازی نهایی زیر زمین	درصد	۱۰۰	60	۶۰	۱۴	۸,۴
۴,۸,۱,۳	نصب سنگ عایق و کفسازی سرویس ها	درصد	۱۰۰		۰	۱۵	۰
۴,۸,۱,۴	کاشی و سرامیک سرویسها	درصد	۱۰۰	40	۴۰	۳۰	۱۲
۴,۸,۱,۵	سفید کاری دیوارها	درصد	۱۰۰		۰	۳۴	۰
ب) پارت جنوبی (۴۰ درصد)							
۴,۸,۲,۱	اندود نهایی دیوارهای زیر زمین	درصد	۱۰۰	40	۴۰	۷	۲,۸
۴,۸,۲,۲	کفسازی نهایی زیر زمین	درصد	۱۰۰	40	۴۰	۱۴	۵,۶
۴,۸,۲,۳	نصب سنگ عایق و کفسازی سرویس ها	درصد	۱۰۰		۰,۰۰	۱۵	۰
۴,۸,۲,۴	کاشی و سرامیک سرویسها	درصد	۱۰۰	40	۴۰	۳۰	۱۲
۴,۸,۲,۵	سفید کاری دیوارها	درصد	۱۰۰		۰,۰۰	۳۴	۰
۱۴,۷۶	جمع کل پیشرفت پارت شمالی						
۸,۱۶	جمع کل پیشرفت پارت جنوبی						
۱,۳۷۵	جمع کل پیشرفت فیزیکی عملیات اجرای عملیات نازک کاری						
۳,۷۲	پیشرفت فیزیکی مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلی در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲						
-۲,۳۴۵	وضعیت تقدم (+) و یا تاخر (-) عملیات اجرایی نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلی						



نمودار ستونی نازک کاری

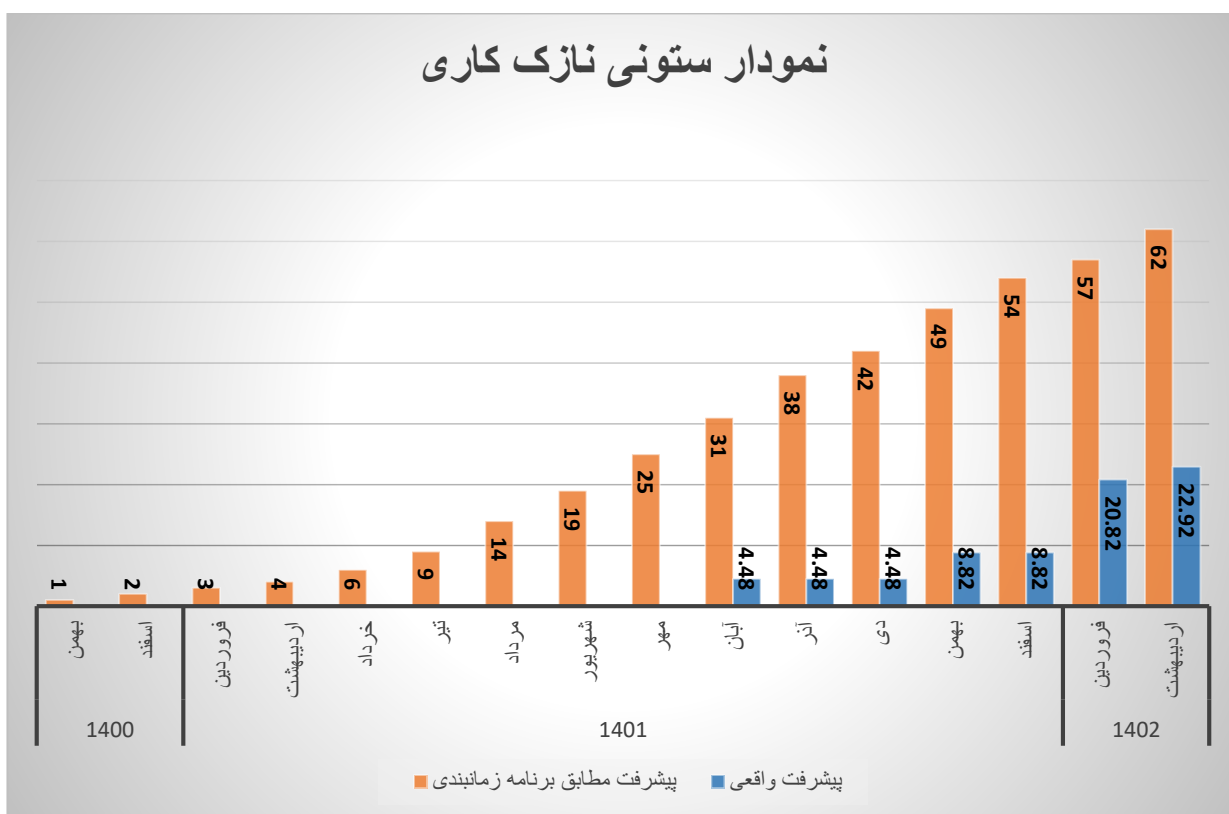



منشور اقلیم سازه
(سهامی خاص)

پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز

عنوان: گزارش ماهیانه اردیبهشت - ۱۴۰۲



خرید تجهیزات مکانیکی

جدول شماره ۱۳- گزارش وضعیت پیشرفت وزنی خرید تجهیزات مکانیکی (درصد وزنی در کل پروژه معادل ۱۰,۵ درصد میباشد)							
خرید و بازرسی تجهیزات مکانیکی							
W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	پیشرفت فیزیکی
۵,۱,۱,۱	خرید اسانسور ها	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۸	۸
۴,۸۰	جمع کل پیشرفت خرید تجهیزات						
۰,۲۹	جمع کل پیشرفت فیزیکی						
۳,۴۶	پیشرفت فیزیکی مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلی در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲						
-۳,۷۴۸	وضعیت تقدم (+) و یا تاخر (-) عملیات اجرایی نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلی						




۳- گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه:

تشریح کلی سرفصل های اصلی برنامه زمان بندی بر اساس توضیحات قید شده در برنامه زمانبندی تفصیلی میباشد که به جهت جلوگیری از ازدیاد حجم گزارش ماهیانه از ارائه مجدد آن خود داری گردیده و گزارش جمع بندی کلی به شرح زیر تقدیم میگردد:

جدول شماره ۱۳ - گزارش وضعیت پیشرفت فیزیکی کل پروژه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱					
W.B.S	شرح عملیات	پیشرفت در کل پروژه	درصد پیشرفت مورد انتظار بر اساس برنامه زمانبندی تفصیلی		درصد پیشرفت فیزیکی انجام شده
			PROGRESS	درصد پیشرفت	
۱	امضا قرارداد و تحویل زمین	۰	۰	۰	۰
۲	طراحی و برنامه ریزی	۳	۱۰۰	۳	۱,۹
۳	تجهیز کارگاه	۴	۱۰۰	۴	۴
۴	عملیات اجرایی	۷۵	---	۴۹,۵۱	۲۴,۷۱
۴,۱	گود برداری و تحکیم	۱۰	۱۰۰	۷,۵	۷,۵
۴,۲	زهکشی و فونداسیون ساختمان	۵	۱۰۰	۳,۷۵	۳,۷۵
W.B.S	شرح عملیات	پیشرفت در کل پروژه	درصد پیشرفت مورد انتظار بر اساس برنامه زمانبندی تفصیلی		درصد پیشرفت فیزیکی انجام شده
			PROGRESS	درصد پیشرفت	
۴,۳	اسکلت سازه و سقفهای زیر زمینی	۶	۱۰۰	۴,۵	۴,۵
۴,۴	اسکلت سازه و سقفهای رو زمینی	۱۴	۷۷	۸,۰۹	۱,۹۰۶
۴,۵	تاسیسات مکانیکی	۱۵	۶۱	۶,۸۲۶	۱,۹۱۶
۴,۶	تاسیسات برقی	۸	۵۳	۳,۱۸	۱,۳۵
۴,۷	سفت کاری	۱۷	۶۵	۸,۴۵	۲,۱۲
۴,۸	نازک کاری	۸	۶۲	۳,۷۲	۱,۳۸
۵,۱	خرید تجهیزات مکانیکی		۳۳	۳,۴۶۵	۰,۲۹
جمع کل پیشرفت فیزیکی پروژه:			۵۶,۵۱	۳۰,۶۰۷	
تقدم (+) و یا تاخر (-) عملیات اجرایی نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلی:					



نمودار پیشرفت فیزیکی کل پروژه

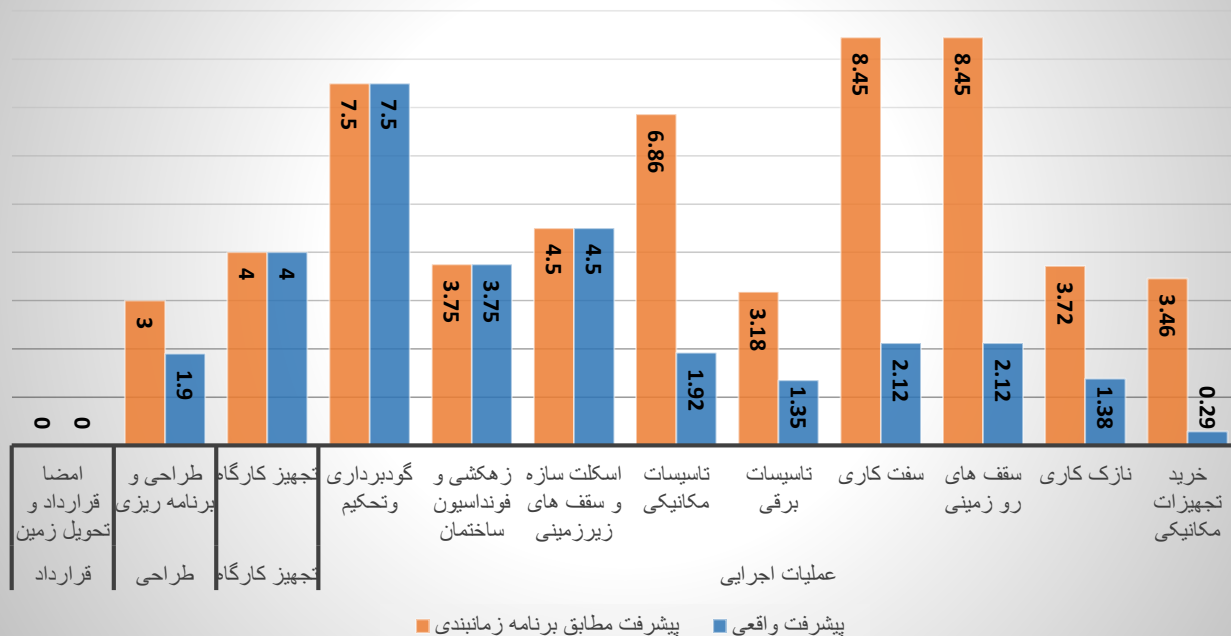




۴ - منابع پروژه:

جدول شماره ۱۴ - وضعیت ماشین آلات و تجهیزات در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲				
ردیف	شرح ماشین آلات	فعال	غیرفعال	مجموع
۱	بولدوزر	۰	۳۰	۳۱
۲	لودر	۲۶	۵	۳۱
۳	دیزل ژنراتور	۲۶	۵	۳۱
۴	پمپ بتن - دو دستگاه	۱۵	۴۷	۶۲
۵	بچینگ	۱۵	۱۶	۳۱
۶	تراک میکسر سه دستگاه	۳۰	۶۳	۹۳
۷	بابکت	۰	۳۱	۳۱
۸	دستگاه خم آرماتور - ۳ عدد	۷۵	۱۸	۹۳
۹	دستگاه خم و برش آرماتور	۲۶	۵	۳۱
۱۰	تاورکری ۱۲ تن	۲۶	۵	۳۱
۱۱	تاورکری ۸ تن	۲۶	۵	۳۱
۱۲	تاورکری ۸ تن (شماره ۳)	۲۶	۵	۳۱
۱۲	آلیماک	۵۲	۱۰	۶۲
۱۳	دستگاه پلیسینگ بوم	۱۲	۱۹	۳۱
۱۴	رزوه زن - چهار دستگاه	۱۰۰	۲۴	۱۲۴
۱۵	خاموت زن - سه دستگاه	۷۵	۱۸	۹۳
۱۶	وانت - دو دستگاه	۵۲	۱۰	۶۲
۱۷	باسکول	۲۶	۵	۳۱
۱۸	کمپرسور هوا	-	-	۳۱



نمودار ماشین آلات

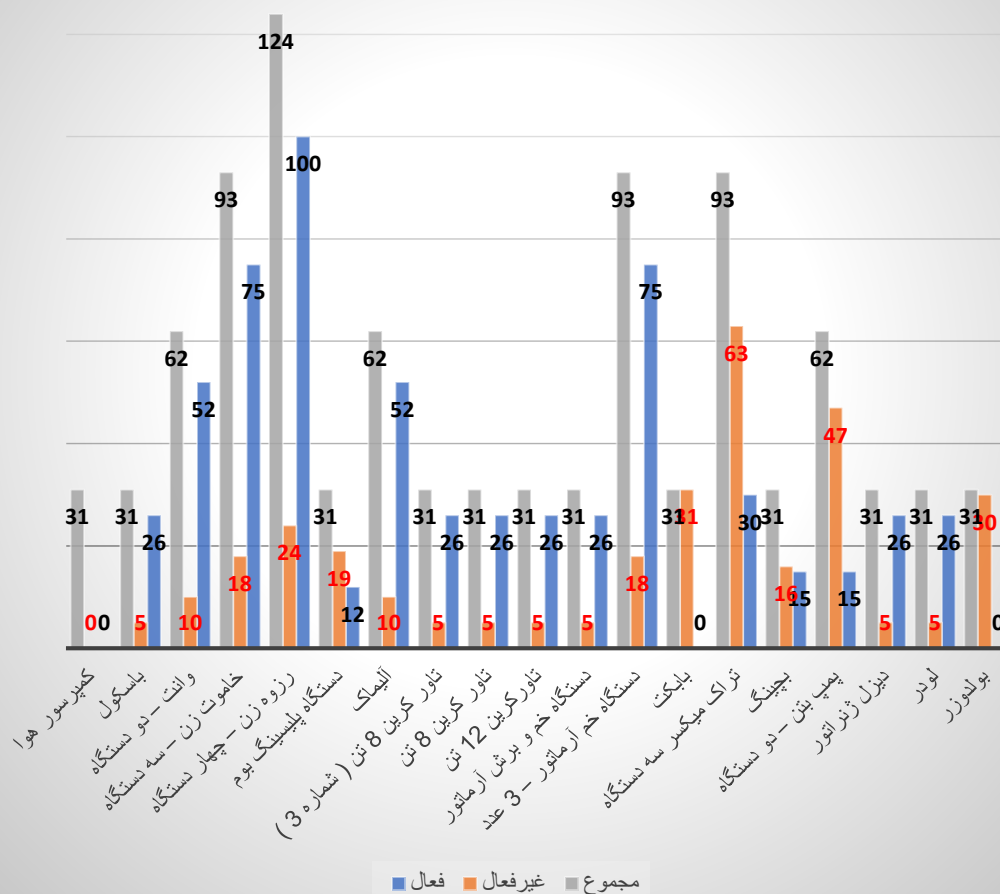




جدول شماره ۱۵ - شرح نیروی انسانی موجود در کارگاه در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲

ردیف	نیروی انسانی به تفکیک تخصص	تعداد
۱	سرپرست کارگاه	۱
۲	مهندسین اجرایی	۶
۳	سرپرست دفتر فنی	۱
۴	کنترل پروژه	۳
۵	مالی و اداری	۲
۶	ماشین آلات	۱۸
۷	انبار	۴
۸	نقشه بردار	۲
۹	سرکارگر	۱
۱۰	کارگر	۲۱
۱۱	حراست فیزیکی	۱۵
۱۲	نگهبان	۳
۱۳	پشتیبانی	۲
۱۴	ایمنی	۳

نیروی انسانی به تفکیک تخصص

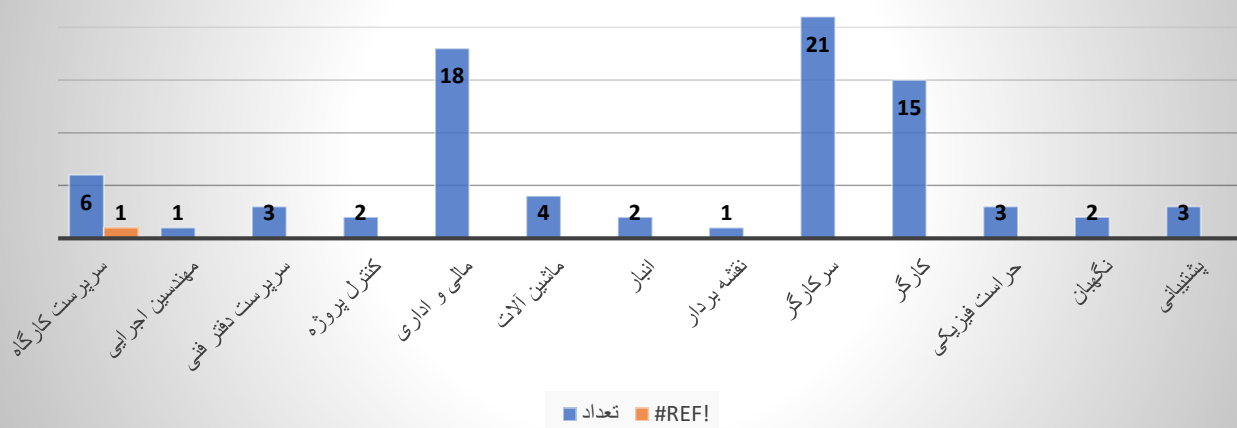

جدول شماره ۱۶ - شرح نیروهای انسانی پیمانکاران شاغل در پروژه

گروه مطالعاتی: برنامه ریزی و کنترل پروژه	شناسه: MC - MR - ۳۱	تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شماره صفحه: ۴۰
--	---------------------	-------------------	----------------



ردیف	پیمانکار	تعداد
۱	کیو بوید (اسکلت بتنی)	۵۲
۲	تاسیسات مکانیکی	۱۱
۳	شمشکی (تاسیسات برقی)	۵

جدول شماره ۱۷ - شرح مصالح وارده به کارگاه در اسفند ماه سال ۱۴۰۱			
ردیف	مصالح و متریا	احجام	واحد
۱	ماسه	۵۰	کامیون
۲	کانال هواکش	6	طبقه
۳	شن	۴۰	کامیون
۴	لوله گاز	-	کامیون
۵	لوله اطفای حریق	-	کامیون
۶	آرماتور	۳۰	تن

۴- فهرست کارهای پیش بینی شده و لازم الاجرا در خرداد ماه سال ۱۴۰۲:

- تهیه و ارسال نقشه های تاسیسات برق و مکانیک از طرف شریک برای تعاونی
- هماهنگی در دیسپلین های معماری، سازه، برق و مکانیک و نهایی شدن فاز دو از طرف شریک
- انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار سیستم ارتینگ از طرف شریک
- طراحی سیستم ارتینگ از طرف شریک
- برآورد مصالح و تامین سیستم ارتینگ از طرف شریک
- نصب تابلوی اصلی برق ساختمان و کابل گذاری برق از پست منطقه تا تابلو از طرف شریک
- جبران عقب ماندگی عملیات اجرای اسکلت سازه و سقف طبقات منفی یک پارت جنوبی با توجه به وجود جبهه های کاری لازم.
- جبران عقب ماندگی در اجرای سقف طبقات رو زمینی بلوک شمالی
- جبران عقب ماندگی در اجرای تاسیسات مکانیکی بلوک شمالی
- جبران عقب ماندگی در تاسیسات برقی بلوک شمالی
- جبران عقب ماندگی در کفسازی طبقات زیر زمینی بلوک شمالی
- جبران عقب ماندگی در تیغه چینی سقف های رو زمینی بلوک شمالی
- جبران عقب ماندگی در تیغه چینی زیر زمینی برج جنوبی
- کاهش نیروهای اجرایی در پروژه



منشور اقلیم سازه
(سهامی خاص)

پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز

عنوان: گزارش ماهیانه اردیبهشت - ۱۴۰۲



گزارش تصویری پروژه

نمای کلی سازه از ضلع زاویه ی شرقی پروژه - اردیبهشت ۱۴۰۲



منشور اقلیم سازه
(سهامی خاص)

پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز

عنوان: گزارش ماهیانه اردیبهشت - ۱۴۰۲




نمای ضلع جنوبی پروژه - اردیبهشت ۱۴۰۲



منشور اقلیم سازه
(سهامی خاص)

پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز

عنوان: گزارش ماهیانه اردیبهشت - ۱۴۰۲

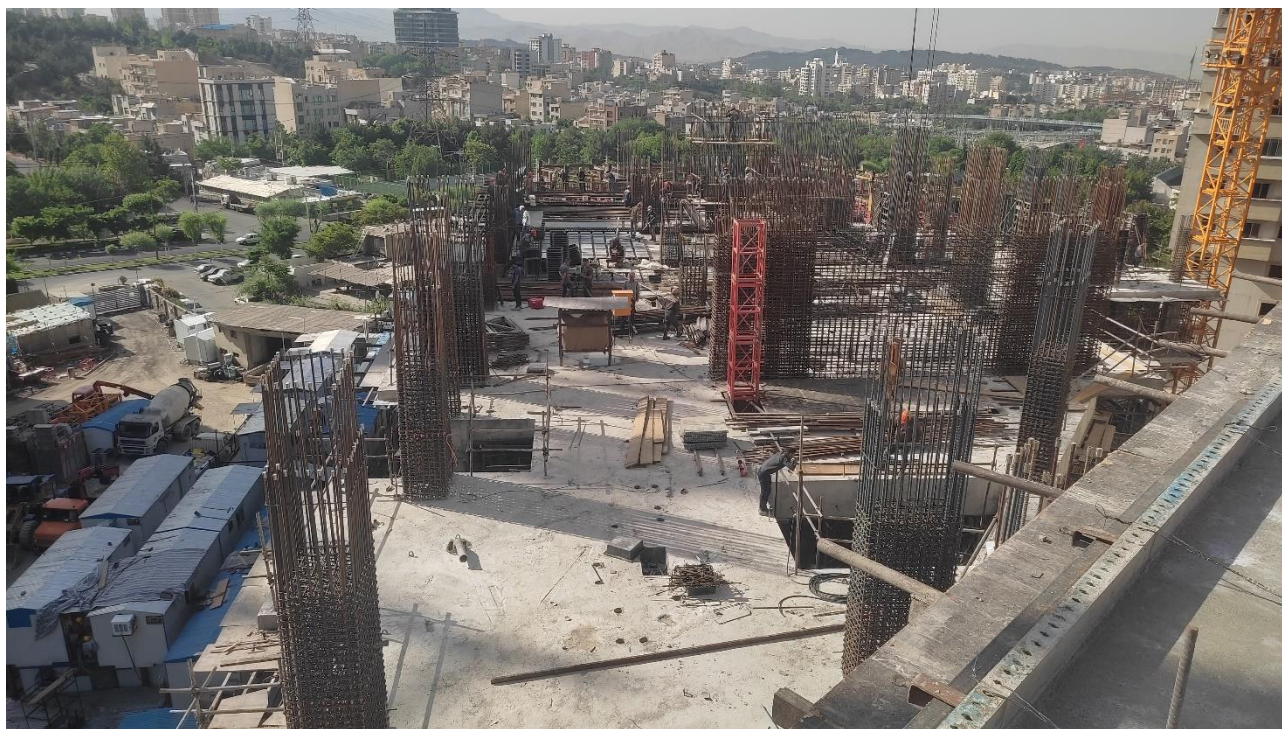

نمایی از سقف برج جنوبی - اردیبهشت ۱۴۰۲



منشور اقلیم سازه
(سهامی خاص)

پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز

عنوان: گزارش ماهیانه اردیبهشت - ۱۴۰۲



عملیات نصب چهارچوب پنجره ها - فروردین ۱۴۰۲

گروه مطالعاتی: برنامه ریزی و کنترل پروژه	شناسه: MC - MR - ۳۱	تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شماره صفحه: ۴۵
--	---------------------	-------------------	----------------



عملیات سقف طبقه چهارم شمالی - اردیبهشت ۱۴۰۲



منشور اقلیم سازه
(سهامی خاص)

پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز

عنوان: گزارش ماهیانه اردیبهشت - ۱۴۰۲



عملیات اجرایی برج شمالی و جنوبی - اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره صفحه: ۴۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

شناسه: MC - MR - ۳۱

گروه مطالعاتی: برنامه ریزی و کنترل پروژه



منشور اقلیم سازه
(سهامی خاص)

پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز

عنوان: گزارش ماهیانه اردیبهشت - ۱۴۰۲





منشور اقلیم سازه
(سهامی خاص)

پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز

عنوان: گزارش ماهیانه اردیبهشت - ۱۴۰۲




اجرای کفسازی پارکینگ شمالی و جنوبی - اردیبهشت ۱۴۰۲



منشور اقلیم سازه
(سهامی خاص)

پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز

عنوان: گزارش ماهیانه اردیبهشت - ۱۴۰۲

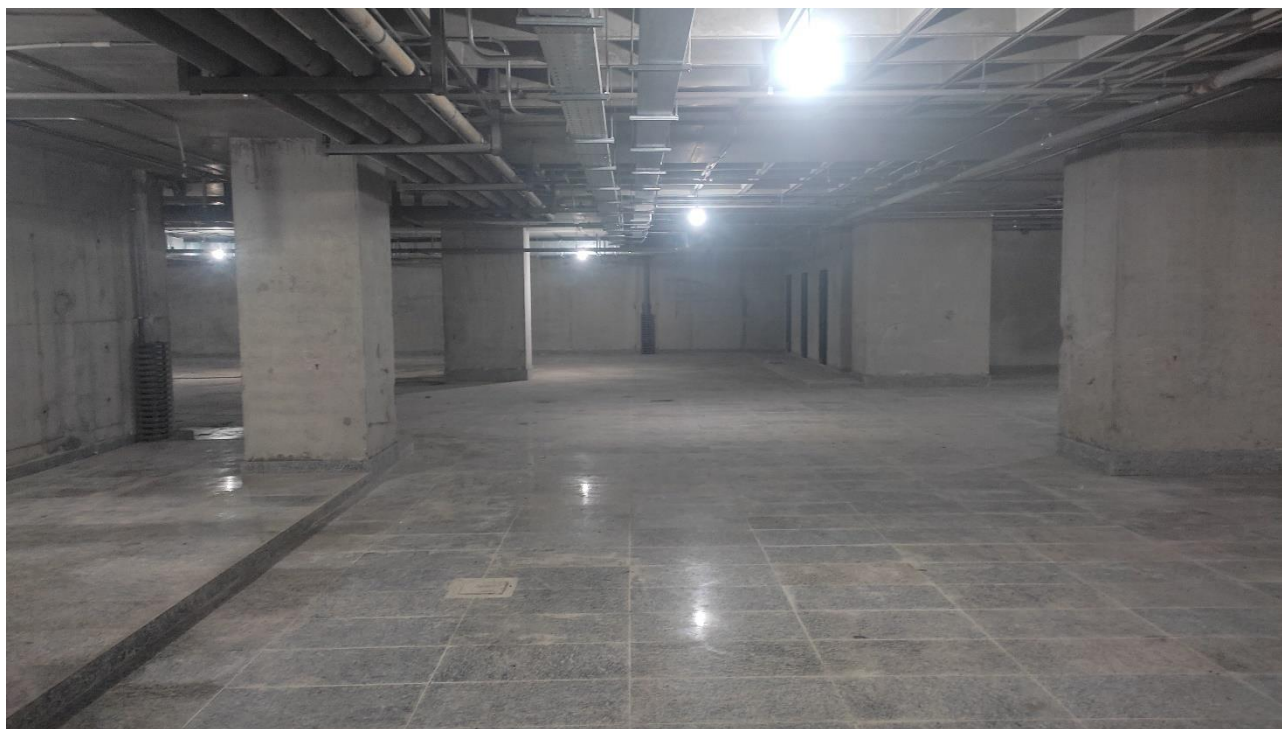



شروع دیوار چینی طبقه اول - شمالی - اردیبهشت ۱۴۰۲

گروه مطالعاتی: برنامه ریزی و کنترل پروژه	شناسه: MC - MR - ۳۱	تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شماره صفحه: ۵۱
--	---------------------	-------------------	----------------



نمایی از عملیات اجرایی برج جنوبی- اردیبهشت ۱۴۰۲

گروه مطالعاتی: برنامه ریزی و کنترل پروژه	شناسه: MC - MR - ۳۱	تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شماره صفحه: ۵۲
--	---------------------	-------------------	----------------



منشور اقلیم سازه
(سهامی خاص)

پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز

عنوان: گزارش ماهیانه اردیبهشت - ۱۴۰۲



نمایی از کارهای اجرایی - اردیبهشت ۱۴۰۲

گروه مطالعاتی: برنامه ریزی و کنترل پروژه	شناسه: MC - MR - ۳۱	تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شماره صفحه: ۵۳
--	---------------------	-------------------	----------------



منشور اقلیم سازه
(سهامی خاص)

پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز

عنوان: گزارش ماهیانه اردیبهشت - ۱۴۰۲





منشور اقلیم سازه
(سهامی خاص)

پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز

عنوان: گزارش ماهیانه اردیبهشت - ۱۴۰۲



بازدید اعضا محترم تعاونی مسکن از پروژه - اردیبهشت ۱۴۰۲



منشور اقلیم سازه
(سهامی خاص)

پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز

عنوان: گزارش ماهیانه اردیبهشت - ۱۴۰۲





منشور اقلیم سازه
(سهامی خاص)

پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز

عنوان: گزارش ماهیانه اردیبهشت - ۱۴۰۲





منشور اقلیم سازه
(سهامی خاص)

پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز

عنوان: گزارش ماهیانه اردیبهشت - ۱۴۰۲

