



شماره گزارش : ۱۱

کارفرما: تعاونی مسکن شمیران

منشور اقلیم سازه
(سهامی خاص)

تاریخ تنظیم : ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مدیر طرح: مهندسین مشاور منشور اقلیم سازه

گزارش عملکرد دوره ای

انجام خدمات مدیریت طرح پروژه مشارکت در ساخت تعاونی مسکن شمیران

شهریورماه سال

۱۴۰۰



- ساختمان های مسکونی
- ساختمان تجاری
- ساختمان های اداری
- ساختمان های صنعتی
- محیط زیست
- فضای سبز
- سازه

بخش اول

قرارداد مشارکت در ساخت تعاونی مسکن شمیران

کارمندان شهرداری منطقه ۱

گزارش ماهیانه شماره ۱۱ - شهریور ماه سال ۱۴۰۰

کارفرما : تعاونی مسکن شهرداری منطقه یک تهران (شمیران)

شریک : گروه مهندسی پژمان جوزی و همکاران

منتهی به سی و یکم شهریور ماه سال ۱۴۰۰

تعاونی مسکن شمیران

تهران، تجریش، میدان قدس، خیابان شهید باهنر، ابتدای دزاشیب، بن بست جعفری، پلاک ۱۶



فهرست مطالب

۳	مشخصات پروژه.....
۴	پلان کلی موقعیت زمین.....
۵	اقدامات انجام شده تا تاریخ سی و یکم شهریور ماه ۱۴۰۰.....
۲۴	فعالیت های در دست اقدام و یا تکمیل شده در شهریور ماه سال ۱۴۰۰.....
۲۹	وضعیت منابع پروژه.....
۳۰	شرح ماشین آلات و تجهیزات موجود در کارگاه در شهریور ماه سال ۱۴۰۰.....
۳۰	نمودار ماشین آلات و تجهیزات موجود در کارگاه در شهریور ماه سال ۱۴۰۰.....
۳۲	شرح نیروی انسانی موجود در کارگاه در شهریور ماه سال ۱۴۰۰.....
۳۳	شرح مصالح وارده به کارگاه در شهریور ماه سال ۱۴۰۰.....
۳۴	گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه.....
۳۸	مشکلات و موانع پروژه.....
۳۸	فهرست کارهای پیش بینی شده و لازم الاجرا در ماه آتی.....
۳۹	گزارش تصویری پروژه.....



مشخصات پروژه

قرارداد شماره ۹/ت/م/۱۴۰/ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ با موضوع مشارکت در ساخت شش دانگ پلاک ثبتی ۲۵ اصلی از ۳۹۳۶ فرعی، قطعه نهم ملکی فی مابین شرکت تعاونی مسکن شمیران کارمندان شهرداری منطقه ۱ و گروه مهندسی پژمان جوی و شرکاء با مشخصات ذیل منعقد گردیده است.

مشارکت در ساخت شش دانگ پلاک ثبتی ۲۵ اصلی از ۳۹۳۶ فرعی، قطعه نهم ملکی شرکت تعاونی مسکن شمیران کارمندان شهرداری منطقه ۱ (که شریک متعهد میگردد مطابق پروانه ساختمانی صادره به شماره ۱۰۰۲۰۲۳۸ مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۲ در پرونده شهرداری ۱۰۰۶۲۹۰۳ ضمن پرداخت تمامی هزینه های ساخت نسبت به مدیریت، سرمایه گذاری، طراحی، ساخت کل مجتمع و همچنین تعمیر و نگهداری یکساله تأسیسات و تجهیزات مجتمع، در قطعه زمین متعلق به تعاونی واقع در تهران، بزرگراه ارتش، بلوار اوشان، بلوار ۳۵ متری، جنب پروژه مخابرات به شرح ذیل و انجام محوطه سازی و دیوارکشی کل پروژه و سایر موارد طبق ضوابط شهرسازی و مقررات ملی زمین و مسکن و سایر ضوابط به همراه تجهیز و برچیدن کارگاه با کلیه کارهای مربوطه طبق نقشه های اجرایی و مشخصات فنی که در ادامه اجرای این قرارداد توسط شریک تهیه و به تأیید تعاونی میرسد.


جدول شماره ۱ - مشخصات موضوع قرارداد بر اساس پروانه ساختمانی اخذشده توسط تعاونی

ردیف	شماره پلاک	مساحت عرصه (مترمربع)	کاربری	مساحت زیربنای مجاز طبق پروانه ساختمانی (مترمربع)
۱	۲۵/۳۹۳۶/۹	۷۲۲۵/۷۲ با توجه به توضیحات تبصره ۱ بند ۱-۳ ماده ۳ قرارداد حاضر	مسکونی	۶۷۵۰۰
			تجاری	۳۰۰۰
			پارکینگ مسکونی	۲۳۸۷۲/۱۸
			پارکینگ تجاری	۲۲۶۰/۰۳
			پله و آسانسور	۱۵۰۱۳/۵
			محوطه سازی	سطح موجود

خدمات مدیریت طرح پروژه از طرف تعاونی مسکن شمیران به عنوان کارفرما، به شرکت مهندسیین مشاور منشور اقلیم سازه طی قرارداد شماره ۸/ت/م/۱۴۰/ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ واگذار گردید.



پلان کلی موقعیت زمین

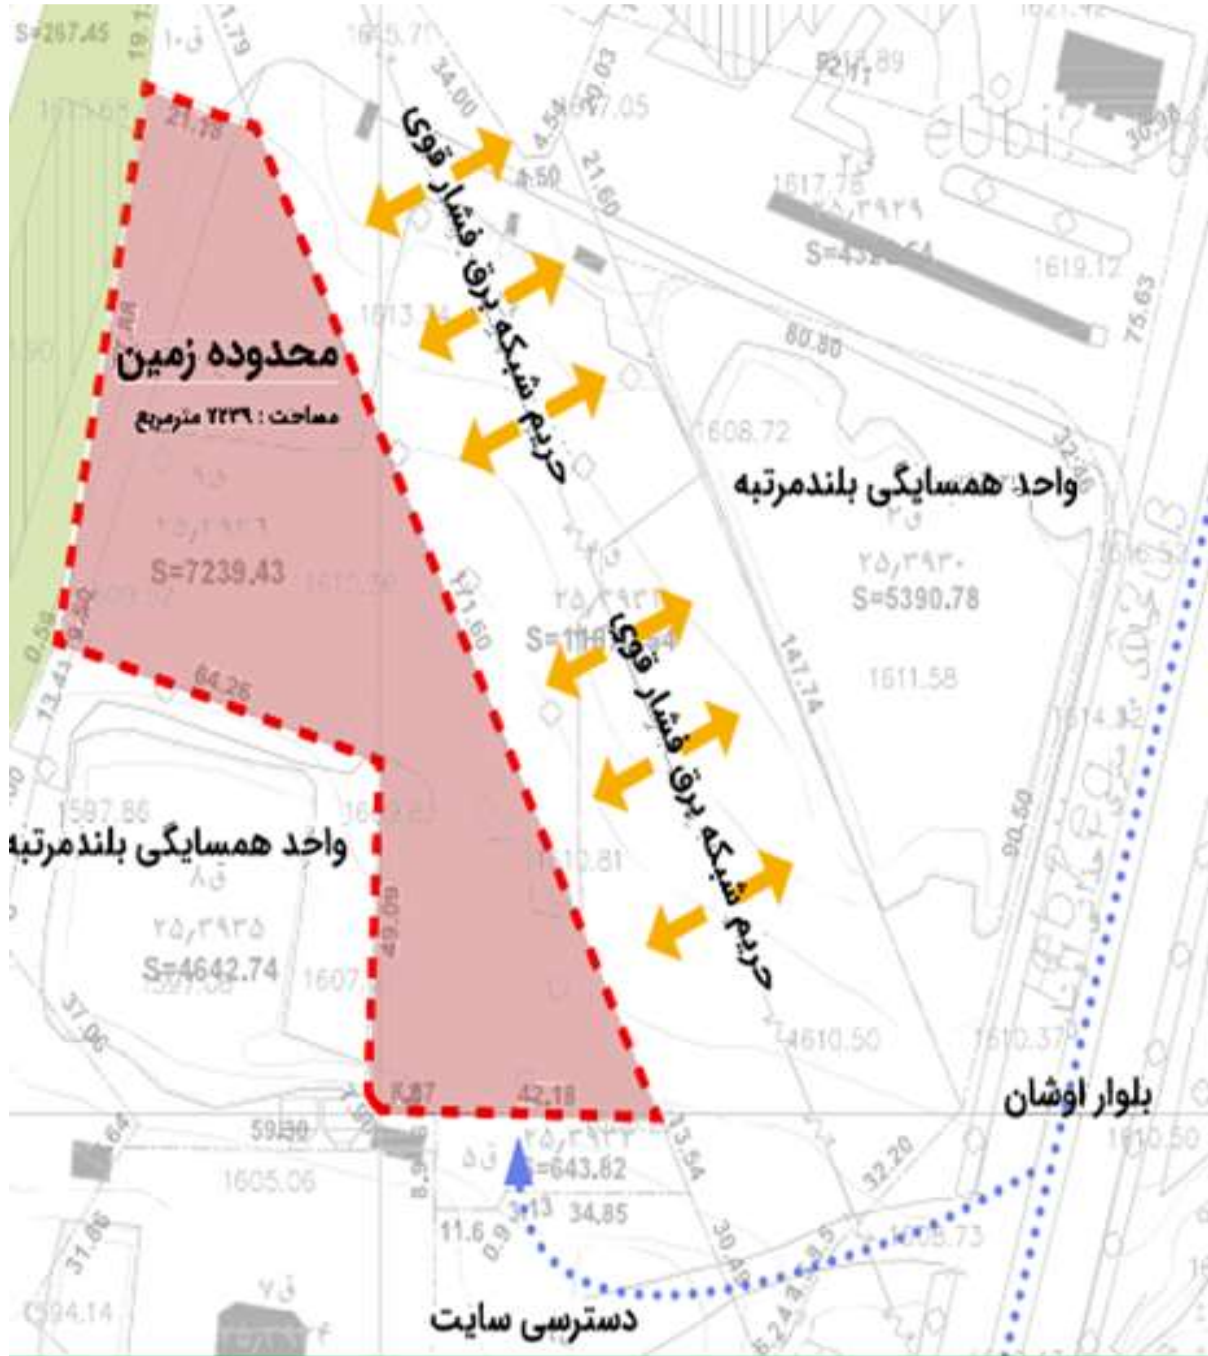

اقدامات انجام شده تا تاریخ سی و یکم شهریور ماه سال ۱۴۰۰

الف) موارد حقوقی و قراردادی

۱- رفع معارض :

- اصلاح ابعاد زمین در جهت رفع هر گونه معارض
- رفع توقیف سند زمین (توضیح اینکه بدلیل عدم پرداخت عوارض مربوط به سازمان تامین اجتماعی سند زمین توقیف بوده است)
- اخذ نامه از شهرداری بابت لزوم خاکبرداری محدوده بین خط گود و زمین ملک مجاور (برج ستاره) و ابلاغ به مالکین مربوطه (تعاونی مسکن مخابرات). توضیح اینکه محدوده بین دو زمین عرض محدودی دارد و حفظ خاک موجود که به صورت دستی هم می باشد امکان پذیر نمی باشد و لذا این حجم خاک برداشته شده و بعد از احداث فونداسیون ساختمان ، مجدد بکفیل خواهد شد .
- تمدید جواز ساختمان تا پایان سال ۱۴۰۰

۲- تامین زیر ساخت ها

- ۱-۲- سیستم های ارتباطی
 - اخذ انشعاب تلفن ۱۰ خط
 - سیستم سانترال برای خط داخلی تلفن و برقراری شبکه داخلی (Intera Net)
 - برقراری اینترنت کابلی و وای فای
 - ۲-۲- برق رسانی
 - تامین برق توسط سه دستگاه ژنراتور ۱۰۰ کاوا (KVA) و یک دستگاه ژنراتور جدید ۵۰۰ (KVA)
 - اخذ انشعاب برق کارگاهی ۲۵۰ آمپر
 - ۲-۳- انشعاب گاز کارگاهی
 - اخذ انشعاب گاز کارگاهی با ظرفیت جی ۲۵
 - لوله کشی گاز داخل کارگاه جهت موتور خانه
 - ۲-۴- انشعاب آب
 - نصب دو منبع آب (به ظرفیت کل ۱۵۰۰۰ لیتر) و نصب تصفیه خانه برای مصارف بهداشتی
 - تامین آب آشامیدنی توسط تانکر
 - پیگیری برقراری انشعاب آب (در دست اقدام)
- #### ۳- آماده سازی زمین و حراست کارگاه
- پیاده سازی نقاط نقشه برداری روی زمین
 - تسطیح و حصارکشی دور زمین
 - نصب درب ورودی کارگاه

- اجرای فضای سبز ورودی کارگاه
- شن ریزی مستمر جهت جلوگیری از گل و لای شدن مسیر های تردد (در دست اقدام)
- اجرای آسفالت سرد محوطه

۴- تامین فضای استقرار نفرات

- زیر سازی و اجرای شاسی فلزی جهت نصب کانکس ها
- تهیه و نصب و مبلمان ۲۵ دستگاه کانکس دفتری (دو دستگاه در اختیار نمایندگان تعاونی)
- تهیه و نصب ۳۵ دستگاه کانکس جهت پیمانکاران جزء و اسکان نیروهای کارگری
- تامین ۷ دستگاه کانکس جهت آبدارخانه و سرویس بهداشتی برای مجموعه های دفتری و کارگری
- تامین سرمایش کلیه کانکس ها از طریق کولر آبی و اسپیلیت
- تامین گرمایش کلیه کانکس ها از طریق سیستم موتورخانه و رادیاتور شوفاژ
- احداث اسکلت فلزی و نصب کانکس در مجاور کانکس های دفتری موجود در حاشیه پیاده رو خیابان دریا

۵- کنترل تردد و حفاظت فیزیکی پروژه

- عقد قرارداد حفاظت فیزیکی با گروه حراست مورد تائید نیروی انتظامی و نگهبانی ۲۴ ساعته کارگاه
- نصب و راه اندازی سیستم مونیترینگ شامل ۴۰ دستگاه دوربین
- احداث اتاق کنترل ورود و خروج و سیستم ساعت زن

۶- تامین زمین جهت تجهیز کارگاه

توضیح : بدلیل محدودیت فضا در زمین پروژه، زمین مجاور شرقی به مساحت ۱۱ هزار متر مربع اجاره شده و اقدامات زیر در آن انجام شده است :

- تسطیح زمین و تخلیه نخاله ها و وسایل اضافه از آن
- حصارکشی دور زمین مربوطه
- نصب درب کارگاهی بزرگ جهت تردد ماشین آلات سنگین
- احداث اتاق نگهبانی ۲۴ ساعته در ورودی زمین

۷- ساختمان های پشتیبانی

- تامین دو دستگاه کانتینر به عنوان انبار
- احداث فضای انبار روباز بین دو کانتینر
- تامین فضای سایت آرماتور (در حال حاضر در اختیار پیمانکار پایدارسازی است).
- احداث موتورخانه شوفاژ
- برچیدن سقف تعمیرگاه بنا به هشدار ایمنی اداره برق
- ایمن سازی ساختمان تعمیرگاه در مقابل برق فشار قوی و شروع به اجرای سقف غیرفلزی برای آن

۸- تاسیسات و تجهیزات کارگاهی

- تامین و نصب کامل یک دستگاه باسکول ۶۰ تن و اخذ تائیدیه استاندارد آن
- احداث اتاق آزمایشگاه جهت آزمایش نمونه بتن
- ورود تجهیزات آزمایشگاه
- تامین و نصب دو دستگاه سیلوی سیمان ۱۰۰ تنی
- خرید و نصب یکدستگاه بچینگ ۰,۵ متر مکعبی
- نصب ستون های فلزی، نصب پانل های پیش ساخته و تکمیل دیواره های جداکننده مصالح بچینگ
- تکمیل محل بارگیری تراک ها در بچینگ
- برق رسانی و آبرسانی به بچینگ
- تامین مصالح شن و ماسه و سیمان
- احداث حوضچه پساب دوم بچینگ

۹- تامین ماشین آلات سنگین

- تامین و نصب مخزن گازوئیل برای سوخت ماشین الات
- تامین یک دستگاه لودر
- تامین یک دستگاه پمپ بتن زمینی و ملحقات مربوطه
- تامین و اورهال و نصب یک دستگاه تاور کرین ۱۲ تن پتن در ضلع شمالی
- تامین و اورهال و نصب یک دستگاه تاور کرین ۸ تن پتن در ضلع غربی
- تامین و نصب یک دستگاه بالابر کارگاهی (آلیماک)
- تامین یک دستگاه میکسر بتن، یک دستگاه مینی لودر باب کت و یک دستگاه بنز خاور و نصب جرثقیل ۳ تن بر روی آن
- تامین دو دستگاه میکسر بتن و یک دستگاه پمپ زمینی
- تامین یک دستگاه جرثقیل سه تن
- احداث حوضچه پساب سوم
- نصب مخزن ذخیره پساب و خط پمپاژ
- تامین یک دستگاه تاور کرین ۸ تن زوم لاین (نصب نگردیده است)
- ساخت اتاق سایلنت جهت ژنراتور ۵۰۰ کا و آ (در دست اقدام)



جدول شماره ۲ - گزارش وضعیت پیشرفت وزنی عملیات تجهیز کارگاه (درصد وزنی در کل پروژه معادل ۴ درصد میباشد)

الف) تجهیز اولیه (۳۵ درصد)

W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	درصد پیشرفت فیزیکی
۳,۱,۱	تسطیح و محصور کردن زمین	کلی	۱	۱	۱۰۰	۳	۳
۳,۱,۲	تامین تانکر آب و ژنراتور	عدد	۲+۳	۲+۳	۱۰۰	۲	۲
۳,۱,۳	استقرار کانکسهای دفتری	عدد	۲۵	۲۵	۱۰۰	۴۵	۴۵
۳,۱,۴	استقرار کانکسهای کارگری	عدد	۳۵	۳۵	۱۰۰	۵۰	۵۰

ب) احداث ابنیه و تاسیسات پشتیبانی (۵۰ درصد)

W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	درصد پیشرفت فیزیکی
۳,۲,۱	تامین زمین	کلی	۱	۱	۱۰۰	۵	۵
۳,۲,۲	احداث موتور خانه	کلی	۱	۱	۱۰۰	۱۰	۱۰
۳,۲,۳	احداث انبار	کلی	۱	۱	۱۰۰	۵	۵
۳,۲,۴	احداث باسکول	کلی	۱	۱	۱۰۰	۱۵	۱۵
۳,۲,۵	احداث آزمایشگاه	کلی	۱	۱	۱۰۰	۱۰	۱۰
۳,۲,۶	احداث بچینگ	کلی	۱	۱	۱۰۰	۳۵	۳۵
۳,۲,۷	احداث تعمیرگاه	کلی	۱	۰,۸۵	۱۰۰	۲۰	۲۰

پ) اخذ انشعابات تاسیساتی (۱۵ درصد)


W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	درصد پیشرفت فیزیکی
-------	------------	------	----------	-----------------	----------------	-----------	--------------------



جدول شماره ۲ - گزارش وضعیت پیشرفت وزنی عملیات تجهیز کارگاه (درصد وزنی در کل پروژه معادل ۴ درصد میباشد)

۳,۳,۱	اخذ انشعاب تلفن و اینترنت کلی	۱	۱	۱۰۰	۵	۵
۳,۳,۲	اخذ انشعاب گاز کلی	۱	۱	۱۰۰	۱۵	۱۵
۳,۳,۳	اخذ انشعاب برق کلی	۱	۱	۱۰۰	۳۰	۳۰
۳,۳,۴	اخذ انشعاب آب کلی	۱	۱	۱۰۰	۵۰	۵۰
۳۵	جمع کل پیشرفت تجهیز اولیه					
۵۰	جمع کل پیشرفت احداث ابنیه و تاسیسات پشتیبانی					
۱۵	جمع کل پیشرفت اخذ انشعابات تاسیساتی					
۴ درصد	جمع کل پیشرفت فیزیکی عملیات تجهیز کارگاه					
۴ درصد	پیشرفت فیزیکی مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلی در پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰					
*	وضعیت تقدم (+) و یا تاخر (-) عملیات اجرایی نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلی					

نمودار ستونی پیشرفت تجهیز کارگاه

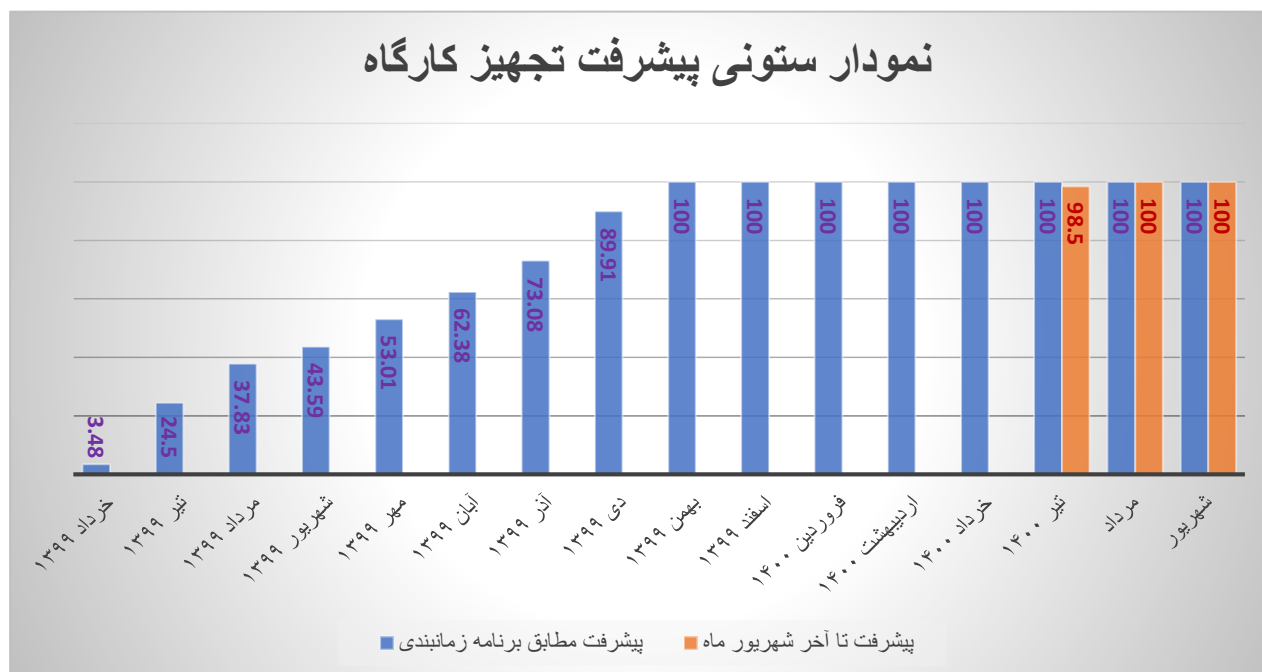



(ب) طراحی

توضیح : (بنا بر اطلاعات اخذ شده از شریک محترم) همزمان با عقد قرارداد ، تیم های طراحی پروژه انتخاب شده اند و تاکنون اقدامات زیر در فرایند طراحی انجام شده است .

۱- پایدارسازی

- انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار (شرکت بسپار پی ایرانیان)
- بازدید میدانی و مطالعات زمین شناسی
- طراحی سیستم پایدارسازی گود
- طراحی سیستم پایدارسازی مجاور برج ستاره

۲- طراحی اصلی ساختمان

- عقد قرارداد با تیم های طراحی
- تهیه طرح اولیه معماری و ارائه به تعاونی
- تنظیم جدول تفکیک واحد ها بر اساس ایده نهایی و نقشه های فاز صفر تهیه شده و تقسیم بندی واحد ها بین طرفین قرارداد (تعاونی و شریک)
- نهایی شدن هماهنگی بین تیم های طراحی
- آماده شدن نقشه های سازه ای فونداسیون و اسکلت سازه و سقف تا تراز صفر
- فاز دو طراحی در دیسپلین های معماری، سازه، برق و مکانیک (در دست اقدام)

۳- طراحی سیستم زهکشی

- انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار سیستم زهکشی
- نهایی شدن طراحی سیستم زهکشی
- اتمام عملیات زهکشی بخش شمالی و شروع عملیات زهکشی در بخش جنوبی

۴-

طراحی سیستم ارتینگ (بنا بر گزارش شریک ولی تا کنون مستندات لازم به تعاونی ارسال

نگردیده است)

- انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار سیستم ارتینگ
- طراحی سیستم ارتینگ (در دست اقدام)
- برآورد مصالح و تامین (در دست اقدام)



جدول شماره ۳ - گزارش وضعیت پیشرفت وزنی عملیات طراحی و برنامه ریزی (درصد وزنی در کل پروژه معادل ۳ درصد میباشد)

الف) طراحی مرحله اول (۲۵ درصد)

W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	درصد پیشرفت فیزیکی
۲,۱,۱	نقشه برداری	کلی	۱	۱	۱۰۰	۵	۵
۲,۲,۲	مطالعات زمین شناسی	کلی	۱	۱	۱۰۰	۵	۵
۲,۲,۳	نقشه های اولیه معماری	کلی	۱	۰,۹۵	۹۵	۴۰	۳۸
۲,۲,۴	مطالعات اولیه سازه	کلی	۱	۰,۹۵	۹۵	۳۰	۲۸,۵
۲,۲,۵	هماهنگی سازه و معماری	کلی	۱	۰,۹۵	۹۵	۲۰	۱۹

ب) برنامه ریزی و مجوزها (۵ درصد)

W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	درصد پیشرفت فیزیکی
۲,۲,۱	برنامه زمانبندی کلی	کلی	۱	۰,۹۵	۹۵	۲۰	۱۹
۲,۲,۲	پوشش های بیمه ای پروژه	کلی	۱	۰,۵	۵۰	۸۰	۴۰


پ) طراحی مرحله دوم (۵۰ درصد)

W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	درصد پیشرفت فیزیکی
۲,۳,۱	نقشه های مرحله دوم معماری	کلی	۱	۰,۱	۱۰	۳۰	۳
۲,۳,۲	نقشه های مرحله دوم سازه	کلی	۱	۰,۴	۴۰	۲۵	۱۰
۲,۳,۳	نقشه های مرحله دوم مکانیک	کلی	۱	۰,۱	۱۰	۲۰	۲
۲,۳,۴	نقشه های مرحله دوم برق	کلی	۱	۰,۱	۱۰	۱۵	۱,۵



جدول شماره ۳ - گزارش وضعیت پیشرفت وزنی عملیات طراحی و برنامه ریزی (درصد وزنی در کل پروژه معادل ۳ درصد میباشد)

W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	درصد پیشرفت فیزیکی
۲,۳,۵	هماهنگی بین دیسپلینها و نهایی شدن مرحله دوم	کلی	۱	۰	۰	۱۰	۰
(ت) طراحی تفصیلی (۲۰ درصد)							
۲,۴,۱	نقشه های تفصیلی معماری	کلی	۱	۰	۰	۳۰	۰
۲,۴,۲	نقشه های تفصیلی سازه	کلی	۱	۰	۰	۲۰	۰
۲,۴,۳	نقشه های معماری داخلی	کلی	۱	۰	۰	۲۵	۰
۲,۴,۴	نقشه های تفصیلی مکانیک	کلی	۱	۰	۰	۱۵	۰
۲,۴,۵	نقشه های تفصیلی برق	کلی	۱	۰	۰	۱۰	۰
۲۳/۸۸	جمع کل پیشرفت طراحی مرحله اول						
۲/۹۵	جمع کل پیشرفت برنامه ریزی و مجوزها						
۸/۲۵	جمع کل طراحی مرحله دوم						
۰	جمع کل طراحی تفصیلی						
۱/۰۵ درصد	جمع کل پیشرفت فیزیکی عملیات طراحی و برنامه ریزی						
۲/۹۸۵ درصد	پیشرفت فیزیکی مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلی در پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰						
۱/۹۳۵- درصد	وضعیت تقدم (+) و یا تاخر (-) عملیات اجرایی نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلی						

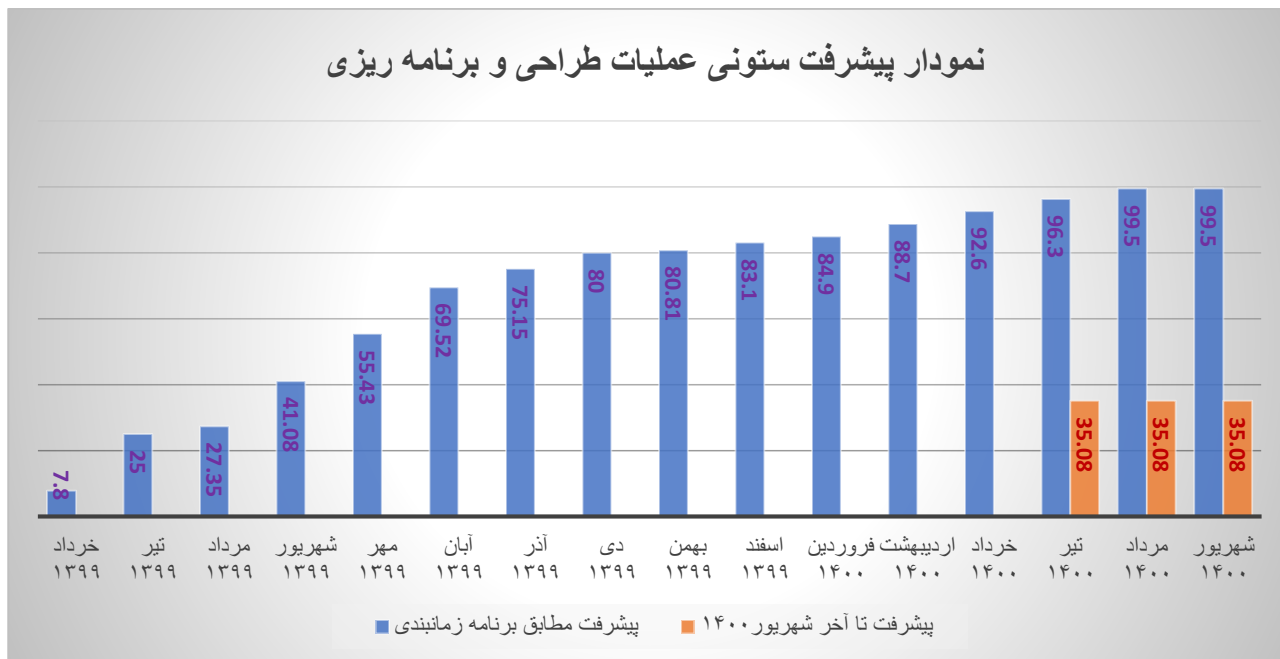

پ) ساخت

۱- عملیات خاکی

توضیح : طرح ساختمان مشتمل بر هفت طبقه پارکینگ است و لذا نیاز به گود برداری از سطح زمین به عمق متوسط ۲۷ متر می باشد (از ۲۴ تا ۳۰ متر) و حجم خاکی حدود ۱۶۰ هزار متر مکعب باید از گود خارج شود.

الف : تجهیز کارگاه

- انتخاب پیمانکار حمل خاک، عقد قرارداد و شروع عملیات اجرایی
- استقرار نفرات در سه دستگاه کانکس تحویلی
- تامین یک دستگاه بیل مکانیکی در ابتدای کار و افزایش تدریجی ناوگان تا حد چهار دستگاه بیل مکانیکی، یک دستگاه پیکور، یک دستگاه لودر(مربوط به شرکت)، یک دستگاه بولدوزر (مقطعی)، یک دستگاه بابکت. سه دستگاه تراک میکسر و یک دستگاه جرثقیل.

- تامین کامیون برای حمل خاک از ۲۰ تا ۵۰ دستگاه بسته به حجم خاک قابل حمل

ب : عملیات اجرایی

- دپوی خاک توسط بیل مکانیکی در محدوده شمالی زمین از ۳ مرداد آغاز شده است (مغزه برداری).
- ایجاد رمپ دسترسی در وسط گود و اصلاح مستمر آن متناسب با پیشرفت کار
- شروع حمل شبانه خاک از تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

- خاکبرداری کنترل شده محدوده مجاور برج ستاره تا تراز زیر فونداسیون با ملاحظات ایمنی
- پنل برداری سطوح دیواره جهت انجام عملیات پایدارسازی
- پیکورزنی سنگ های بزرگ پیدا شده در حین خاکبرداری
- دپو زنی خاک در طول روز
- تا این تاریخ جمعاً ۱۵۹۰۰۰ سرویس خاک (معادل ۱۵۹۰۰۰ مترمکعب) از پروژه حمل شده است. در این ماه حفاری به اتمام رسیده اما بخشی از خاک در ضلع جنوب غربی دپو شده و هنوز حمل نگردیده است.
- عملکرد این ماه ۲۵۰ سرویس معادل (۲۰۰ متر مکعب) می باشد.

۲- عملیات پایدارسازی دیواره های گود

توضیح : گودبرداری به صورت کات و بدون شیب انجام می گیرد و لذا لازم است همزمان با خاکبرداری گود؛ دیوارهای گود به روش مناسب (نیلینگ، استرند یا ستون های برلنی) پایدارسازی شوند. در این ماه عملیات پایدار سازی به اتمام رسید.

۲-۱- تجهیز کارگاه

- استقرار نفرات در ۱۲ دستگاه کانکس تحویلی .
- ورود تجهیزات پایدارسازی شامل سه دستگاه دریل واگن ، یک دستگاه کیسینگ، چهار دستگاه کمپرسور، دو دستگاه شاتکریت ، یک دستگاه دیزل ژنراتور و یک ست تزریق، تانکر هوا ، تانکر آب و تانکر گازوییل و قیف شاتکریت و تجهیزات تست کشش .

۲-۲- عملیات تحکیم دیواره ها

- از تاریخ ۱۵ مرداد خاکبرداری پله اول در ضلع شمالی زمین و از تاریخ ۱۷ مرداد عملیات پایدارسازی آغاز شد.
- تا این تاریخ حدود ۱۰۰۶۰ متر مربع از سطح دیواره ها پانل برداری و مش و شاتکریت شده است. و در این ماه حدود ۸۷ متر مربع بوده است. در این ماه عملیات شاتکریت به اتمام رسید.
- میزان حفاری و تزریق از ابتدای پروژه تا این مقطع حدود ۲۴۴۰۲ متر طول و در این ماه حدود ۶۴۲ متر طول بوده است. در این ماه عملیات حفاری و تزریق به اتمام رسید.
- تعداد گمانه های کامل شده از ابتدای پروژه تا این تاریخ ۱۴۰۲ عدد و در این ماه عملیات گمانه زنی به اتمام رسید.

۲-۳- عملیات سازه نگهبان مجاور برج ستاره

حفاری چاه های برلنی در ضلع غربی از تاریخ ۱۷ آذر ماه شروع شده است. طبق گزارش شریک ۵۳۵ متر طول معادل ۳۲ چاه حفاری و در فروردین ماه به اتمام رسید.



جدول شماره ۴ - گزارش وضعیت پیشرفت وزنی عملیات گود برداری و تحکیم (درصد وزنی در کل پروژه معادل ۷.۵ درصد میباشد)

الف) پارت شمالی (۶۵ درصد)

W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	درصد پیشرفت فیزیکی
۴,۱,۱,۲	دپو و حمل خاک	M3	۸۶۸۶۷	۸۶۸۶۷	۱۰۰	۲۰	۲۰
۴,۱,۱,۳	پایدار سازی دیواره شمالی	M2	۲۰۶۷	۲۰۶۷	۱۰۰	۲۰	۲۰
۴,۱,۱,۴	پایدار سازی دیواره شرقی	M2	۲۶۸۳	۲۶۸۳	۱۰۰	۴۰	۴۰
۴,۱,۱,۶	خاکبرداری کنار ملک ۱۴ چاه	M3	۱۲۵۰۰	۱۲۵۰۰	۱۰۰	۱	۱
۴,۱,۱,۷	پایدار سازی بخش شمالی ضلع غربی	M2	۵۴۸	۵۴۸	۱۰۰	۵	۵
۴,۱,۱,۸	۱۴ چاه برلنی شمالی	عدد	۱۴	۱۴	۱۰۰	۵	۵
۴,۱,۱,۹	پایدار سازی ۱۴ چاه برلنی	M2	۵۸۴	۵۸۴	۱۰۰	۹	۹

ب) پارت جنوبی (۳۵ درصد)

W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	درصد پیشرفت فیزیکی
۴,۲,۱,۱	دپو و حمل خاک	M3	۲۹۶۶۷	۲۹۶۶۷	۱۰۰	۱۷	۱۷
۴,۲,۱,۲	خاکبرداری کنار ملک ۱۷ چاه	M3	۱۳۸۵۰	۱۳۸۵۰	۱۰۰	۳	۳
۴,۲,۱,۳	اجرای ۱۷ چاه برلنی	عدد	۱۷	۱۷	۱۰۰	۹	۹
۴,۲,۱,۴	پایدار سازی ۱۷ چاه برلنی	M2	۶۵۰	۶۵۰	۱۰۰	۱۹	۱۹
۴,۲,۱,۵	پایدار سازی بخش جنوبی	M2	۸۱۴	۸۱۴	۱۰۰	۹	۹



جدول شماره ۴ - گزارش وضعیت پیشرفت وزنی عملیات گود برداری و تحکیم (درصد وزنی در کل پروژه معادل ۷.۵ درصد میباشد)


۸,۸۲	۹	۹۸	۲۱۵۱۹	۲۲۰۱۹	M3	برچیدن رمپ	۴,۲,۱,۶
۱۴	۱۴	۱۰۰	۱۹۶۲	۱۹۶۲	M2	پایدار سازی ضلع شرقی	۴,۲,۱,۷
۱۷	۱۷	۱۰۰	۷۵۲	۷۵۲	M2	پایدار سازی ضلع جنوبی	۴,۲,۱,۸
۰	۳	۰	۰	۱	کلی	برچیدن کارگاه پایدار سازی	۴,۲,۱,۹
۶۵	جمع کل پیشرفت پارت شمالی						
۳۴,۸۲	جمع کل پیشرفت پارت جنوبی						
۷/۴۸ درصد	جمع کل پیشرفت فیزیکی عملیات گود برداری و تحکیم						
۷/۵۰ درصد	پیشرفت فیزیکی مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلی در پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰						
۰/۰۲- درصد	وضعیت تقدم (+) و یا تاخر (-) عملیات اجرایی نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلی						



۳- سیستم زهکشی و فونداسیون ساختمان:

جدول شماره ۵ - گزارش وضعیت پیشرفت وزنی سیستم زهکشی و فونداسیون ساختمان (درصد وزنی در کل پروژه معادل ۳,۷۵ درصد میباشد)							
الف) پارت شمالی (۶۰ درصد)							
W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	درصد پیشرفت فیزیکی
۴,۲,۱,۱	اجرای زهکش کف	ML	۴۴۸	۴۴۸	۱۰۰	۱۵	۱۵
۴,۲,۱,۲	اجرای چاه آسانسورهای ۱ تا ۳	عدد	۳	۳	۱۰۰	۵	۵
۴,۲,۱,۳	اجرای فونداسیون	M2	۳۶۴۶,۵	۳۶۴۶,۵	۱۰۰	۷۰	۷۰

نمودار ستونی پیشرفت عملیات گود برداری و تحکیم

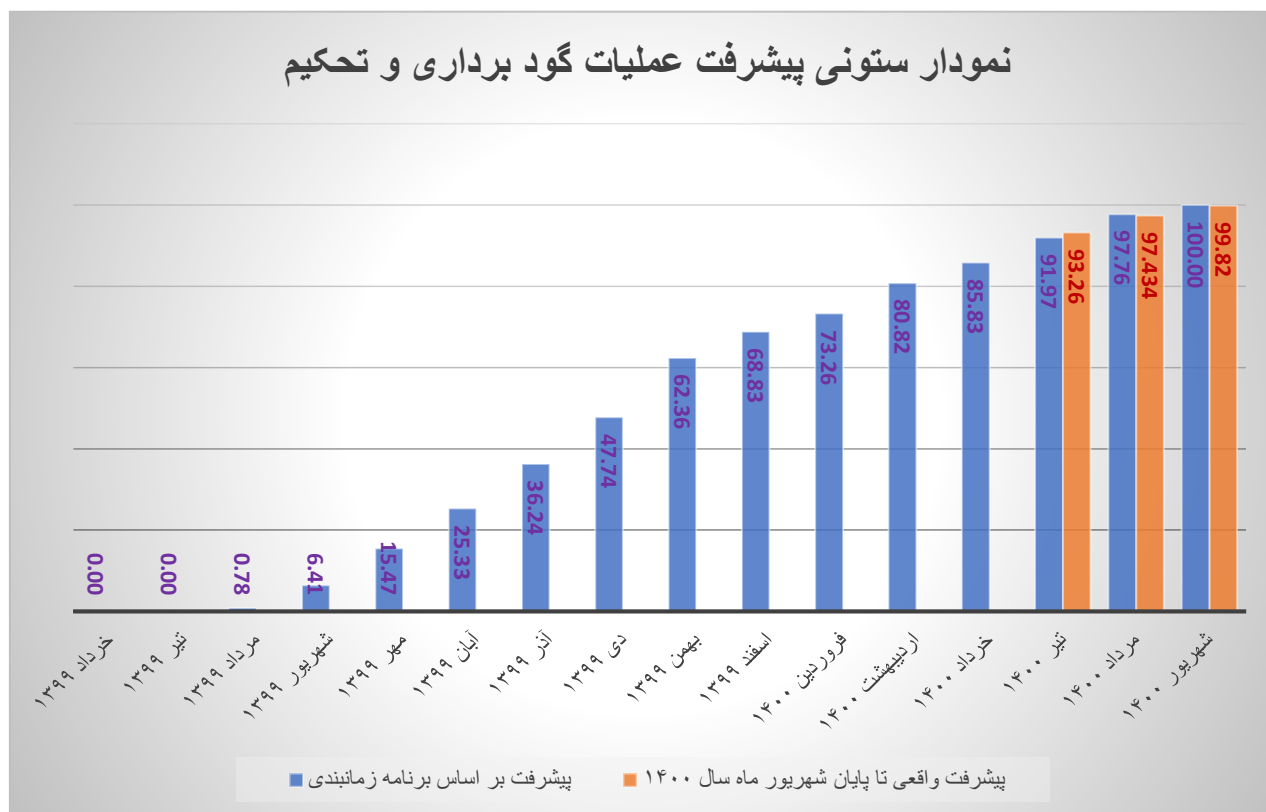




جدول شماره ۵ - گزارش وضعیت پیشرفت وزنی سیستم زهکشی و فونداسیون ساختمان (درصد وزنی در کل پروژه معادل ۳,۷۵ درصد میباشد)


۴,۲,۱,۴	نصب تاور کرین و آلیماک	عدد	۲	۲	۱۰۰	۱۰	۱۰
(ب) پارت جنوبی (۴۰ درصد)							
W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	درصد پیشرفت فیزیکی
۴,۲,۱,۱	اجرای زهکش کف	M3	۲۹۹	۸۹	۲۹,۷۷	۱۵	۴,۴۷
۴,۲,۱,۲	اجرای چاه آسانسورهای ۴ و ۵	M3	۲	۱	۵۰	۵	۲,۵
۴,۲,۱,۳	اجرای فونداسیون	عدد	۲۴۲۷,۶۴	۱۲۱,۴	۵	۷۰	۳,۵
۴,۲,۱,۴	نصب تاور کرین دوم و سوم	M2	۲	۱	۵۰	۱۰	۵
۶۰	جمع کل پیشرفت پارت شمالی						
۱۵,۴۷	جمع کل پیشرفت پارت جنوبی						
۲/۸۳ درصد	جمع کل پیشرفت فیزیکی سیستم زهکشی و فونداسیون ساختمان						
۳,۳۲۴ درصد	پیشرفت فیزیکی مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلی در پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰						
۰/۴۹۳ - درصد	وضعیت تقدم (+) و یا تاخر (-) عملیات اجرایی نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلی						






نمودار ستونی پیشرفت عملیات زهکشی و فونداسیون

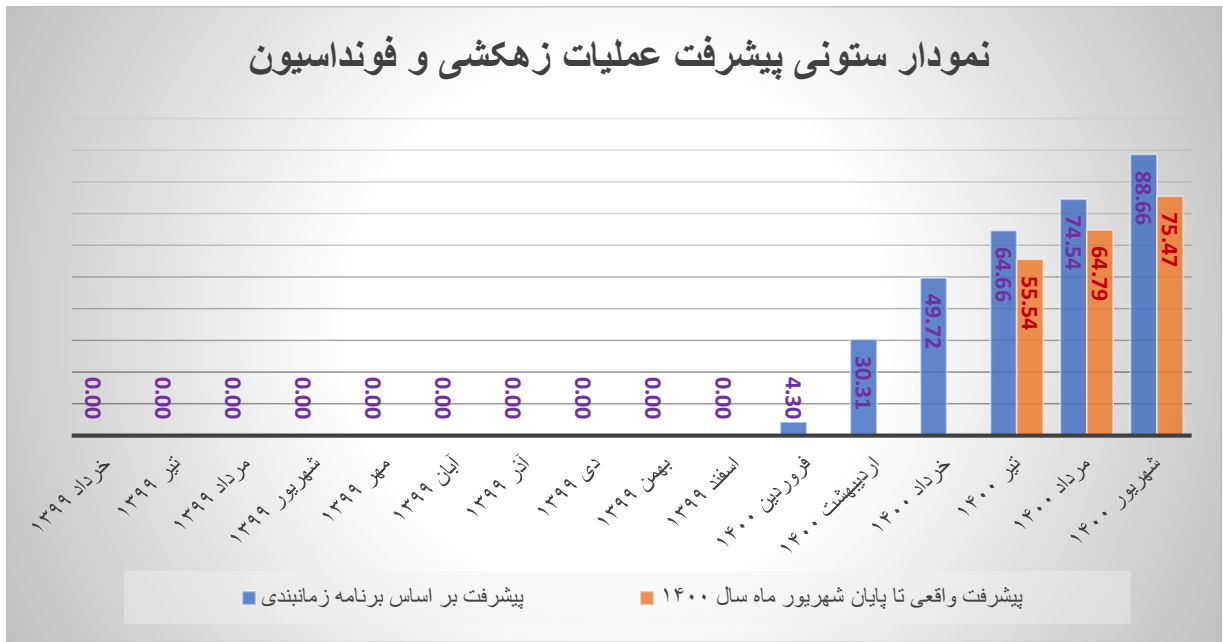

پلان کلی پارت بندی سیستم زهکشی و اجرای فونداسیون

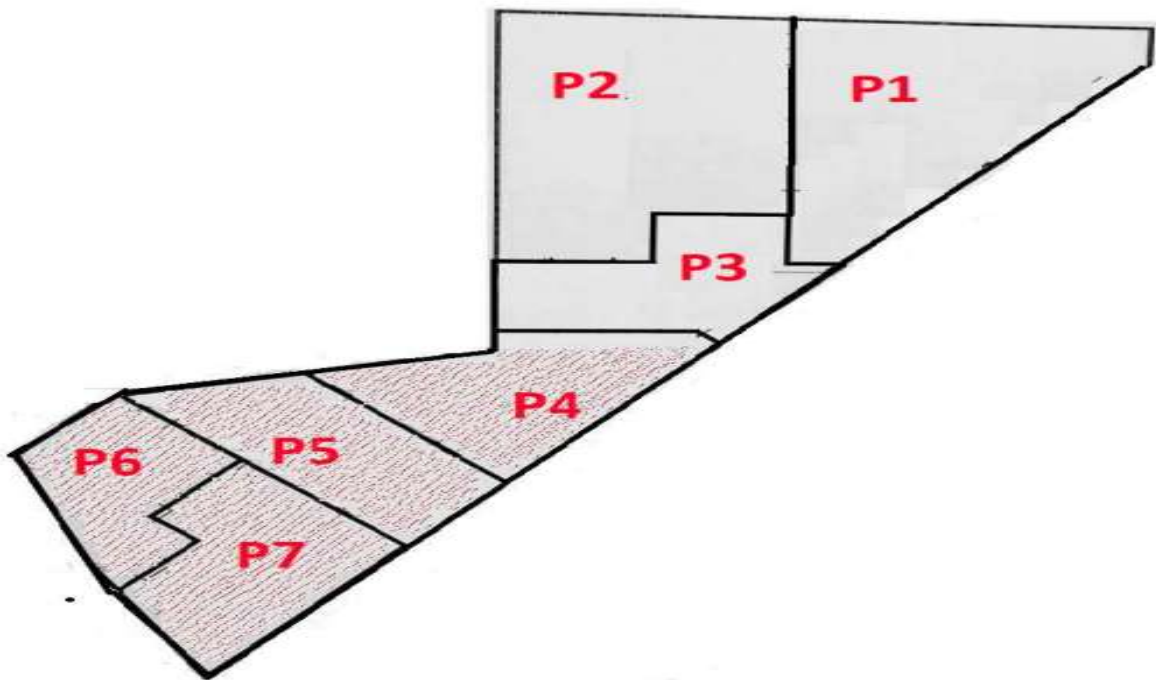

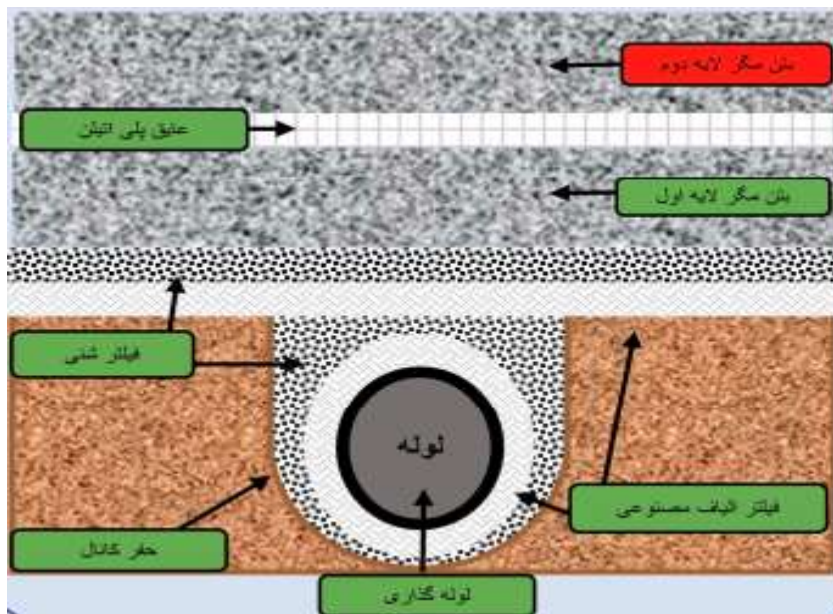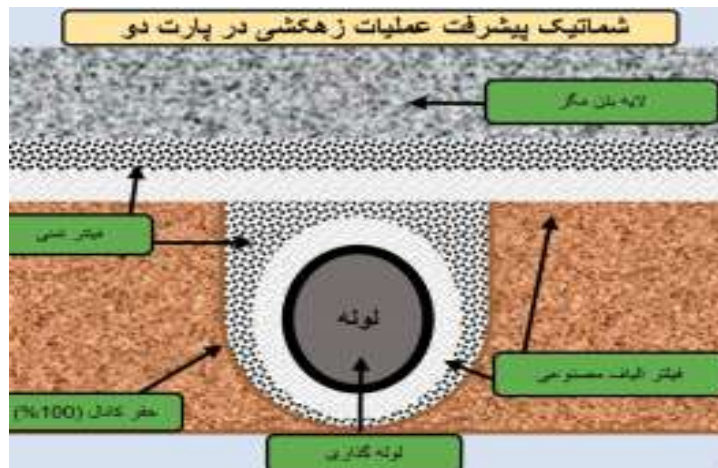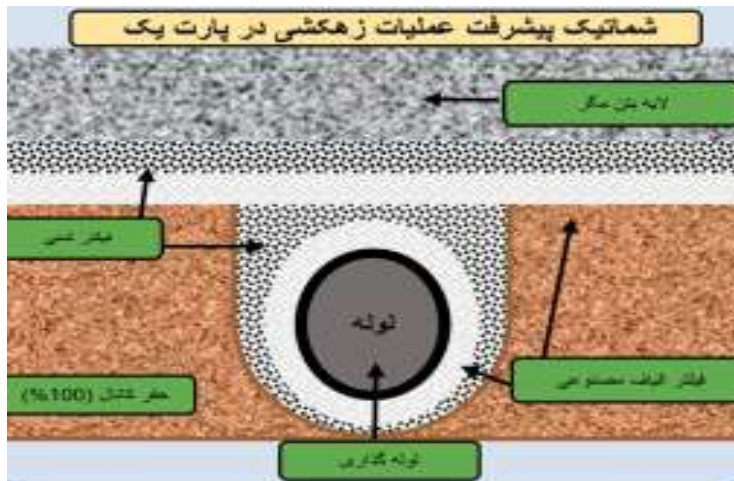

- در طرح ساختمان سیستم زهکشی در کف و دیواره گود پیش بینی شده که قبل از اجرای فونداسیون اجرا خواهد شد و شامل موارد زیر می باشد :
- نصب ورق های دیمپلد شیت در دیواره ها
- اجرای شبکه کانال های زهکشی شامل کانال کنی، قرار دادن لایه فیلتر، نصب لوله های کاروگیت سوراخدار، شن ریزی روی لوله ها
- اجرای بسترسازی گود شامل لایه فیلتر در کف گود، شن ریزی روی لایه فیلتر و اجرای بتن مگر

الف : تجهیز کارگاه

- انتخاب پیمانکار
- استقرار تفرات و تجهیزات در دو دستگاه کانکس تحویلی

ب : عملیات اجرایی

عملیات اجرایی از ۱۵ بهمن ماه در پارت شمالی زمین شروع شده است.

- ایجاد داربست و نصب ورق های دیمپلد در دیواره های شمالی و بخش آماده به کار شرقی و غربی
- حفر کانال های زهکشی
- اجرای عملیات عایق کاری چاله آسانسور سوم
- اجرای فیلتر و لوله گذاری داخل کانال
- اجرای لایه شن روی لوله
- اجرای لایه فیلتر در کف گود
- اجرای لایه شن در کف گود
- اجرای مگر در کف گود
- تاکنون پارت های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ به ترتیب با مساحت ۱۳۲۰ مترمربع ، ۱۹۱۰ مترمربع ، ۸۴۰ مترمربع و ۷۵۰ متر مربع تکمیل شده است. و پارت ۵ با سطح ۶۳۰ مترمربع تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.

۴- عملیات ساخت اسکلت بتنی :

- اجرای اسکلت بتنی در محوطه شمالی سایت شروع گردیده است و در این بخش در این ماه در حال حاضر عملیات زیر در دست اقدام می باشد :
- بتن ریزی دیوار برشی روی فونداسیون
- قالب بندی و بتن ریزی ستون ها طبقه ۵- و ۴- و آرماتور بندی ستون طبقه ۳- پارت ۱
- آرماتور بندی و قالب بندی دیوارهای برشی طبقه ۷-
- آرماتور و قالب بندی و بتن ریزی بندی دیوار حائل طبقه ۵- ضلع شمالی پارت ۲ و روی فونداسیون ضلع غربی و ضلع شرقی و طبقه ۴- ضلع غربی پارت ۲ و شرقی پارت ۱
- کیورینگ بتن



- قالب بندی قابلمه ای (وافل) آرماتور بندی و بتن ریزی دال سقف بتنی در طبقه ۵- پارت ۱ و ۲ و سقف طبقه ۷- پارت ۲ و سقف طبقه ۴- پارت ۱ و ۲
- آرماتور بندی و بتن ریزی کف چاله آسانسور ۳
- شروع آرماتور بندی قالب بندی و بتن ریزی پله طبقه ۷-
- نصب قطعات فلزی دیوار برشی فونداسیون

پیشرفت عملیات اجرای اسکلت سازه بتنی و سقفهای زیر زمینی

جدول شماره ۶ - گزارش وضعیت پیشرفت وزنی عملیات اجرای اسکلت سازه بتنی و سقفهای زیر زمینی (درصد وزنی در کل پروژه معادل ۴.۵ درصد میباشد)							
الف) پارت شمالی (۶۰ درصد)							
W.B.S	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	مقدار انجام شده	درصد انجام شده	درصد وزنی	درصد پیشرفت فیزیکی
۴,۳,۱,۱	طبقه منفی هفت شمالی	M2	۳۶۴۶,۵	۲۶۱۸,۶۳	۷۱,۸۱	۱۵	۱۰,۷۷
۴,۳,۱,۲	طبقه منفی شش شمالی	M2	۳۶۴۶,۵	۱۴۲۸,۶۳	۳۹,۱۸	۱۵	۵,۸۸
۴,۳,۱,۳	طبقه منفی پنج شمالی	M2	۳۶۴۶,۵	۱۴۲۸,۶۳	۳۹,۱۸	۱۵	۵,۸۸
۴,۳,۱,۴	طبقه منفی چهار شمالی	M2	۳۶۴۶,۵	۱۰۰۰	۲۷,۴۲	۱۵	۴,۱۱
۴,۳,۱,۵	طبقه منفی سه شمالی	M2	۳۶۴۶,۵	۱۰۰	۲,۷۴	۱۴	۰,۳۸
۴,۳,۱,۶	طبقه منفی دو شمالی	M2	۳۶۴۶,۵		۰	۱۳	۰
۴,۳,۱,۷	طبقه منفی یک شمالی	M2	۳۶۴۶,۵		۰	۱۳	۰
ب) پارت جنوبی (40 درصد)							
۴,۳,۲,۱	طبقه منفی هفت جنوبی	M2			۰	۱۵	۰
۴,۳,۲,۲	طبقه منفی شش جنوبی	M2			۰	۱۵	۰
۴,۳,۲,۳	طبقه منفی پنج جنوبی	M2			۰	۱۵	۰
۴,۳,۲,۴	طبقه منفی چهار جنوبی	M2			۰	۱۵	۰




جدول شماره ۶ - گزارش وضعیت پیشرفت وزنی عملیات اجرای اسکلت سازه بتنی و سقفهای زیر زمینی (درصد وزنی در کل پروژه معادل ۴.۵ درصد میباشد)

۰	۱۴	۰			M2	طبقه منفی سه جنوبی	۴,۳,۲,۵
۰	۱۳	۰			M2	طبقه منفی دو جنوبی	۴,۳,۲,۶
درصد پیشرفت فیزیکی	درصد وزنی	درصد انجام شده	مقدار انجام شده	مقدار کل	واحد	شرح عملیات	W.B.S
۰	۱۳	۰			M2	طبقه منفی یک جنوبی	۴,۳,۲,۷
۲۷,۰۲	جمع کل پیشرفت پارت شمالی						
۰	جمع کل پیشرفت پارت جنوبی						
۱,۲۱۶ درصد	جمع کل پیشرفت فیزیکی عملیات اجرای اسکلت سازه بتنی و سقفهای زیر زمینی						
۱,۲۸۱ درصد	پیشرفت فیزیکی مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰						
۰/۰۶۵- درصد	وضعیت تقدم (+) و یا تاخر (-) عملیات اجرایی نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلی						



نمودار ستونی پیشرفت عملیات اجرای اسکلت سازه بتنی و سقفهای زیر زمینی

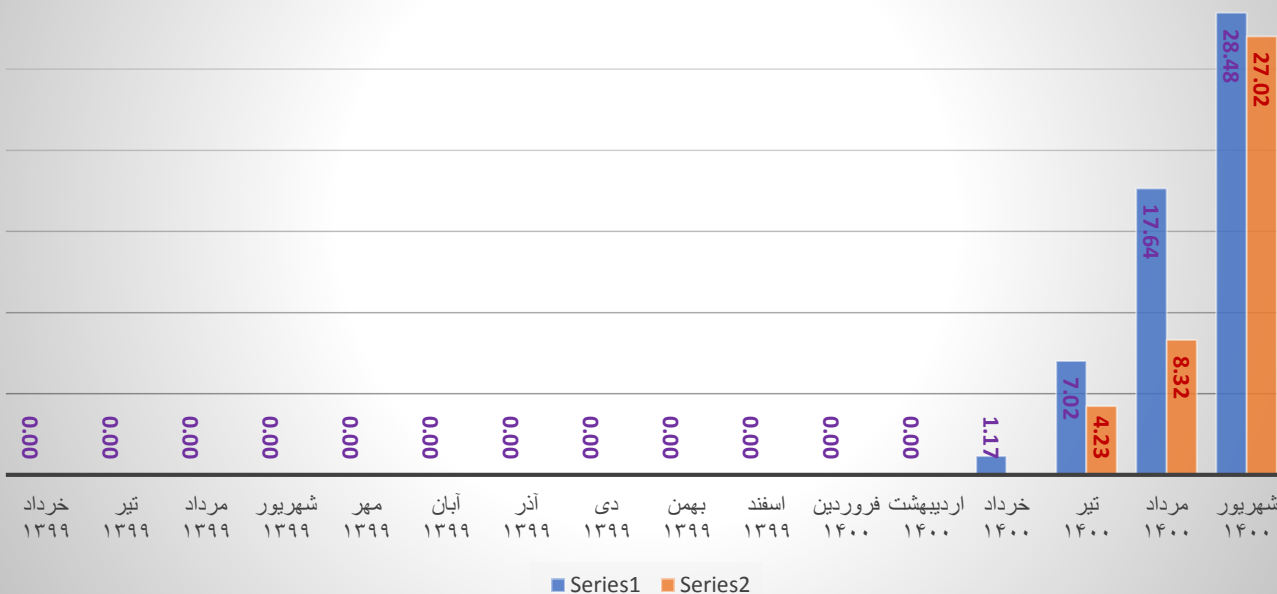

ت) فعالیت های در دست اقدام و یا تکمیل شده در شهریور ماه سال ۱۴۰۰

فعالیت های تکمیل شده یا در دست اقدام مطابق با W.B.S برنامه زمانبندی مصوب پروژه تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ به شرح زیر گزارش میگردد:

جدول شماره ۷ - گزارش وضعیت پیشرفت وزنی عملیات پایان یافته و در دست اقدام پروژه					
۱- طراحی و برنامه ریزی					
W.B.S	شرح عملیات	تاریخ شروع طبق برنامه	تاریخ خاتمه طبق برنامه	درصد انجام شده	درصد طبق برنامه
۲,۱	طراحی مرحله اول	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۹۵,۵	۱۰۰
۲,۱,۱	نقشه برداری	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۰۰	۱۰۰
۲,۲,۲	مطالعات زمین شناسی	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱۰۰	۱۰۰
۲,۲,۳	نقشه های اولیه معماری	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۹۵	۱۰۰



جدول شماره ۷ - گزارش وضعیت پیشرفت وزنی عملیات پایان یافته و در دست اقدام پروژه

۱۰۰	۹۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	مطالعات اولیه سازه	۲,۲,۴
۱۰۰	۹۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	هماهنگی سازه و معماری	۲,۲,۵
۱۰۰	۵۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	برنامه ریزی و مجوزها	۲,۲
۱۰۰	۹۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	برنامه زمانبندی کلی	۲,۲,۱
۱۰۰	۵۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	پوشش های بیمه ای پروژه	۲,۲,۲
۱۰۰	۱۶,۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	طراحی مرحله دوم	۲,۳
۱۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	نقشه های مرحله دوم معماری	۲,۳,۱
۱۰۰	۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	نقشه های مرحله دوم سازه	۲,۳,۲
۱۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	نقشه های مرحله دوم مکانیک	۲,۳,۳
۱۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	نقشه های مرحله دوم برق	۲,۳,۴
۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هماهنگی بین دیسپلینها و نهایی شدن مرحله دوم	۲,۳,۵
۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	تایید مرحله دوم توسط تعاونی	۲,۳,۶
				شرح عملیات	W.B.S
	درصد انجام شده	تاریخ خاتمه طبق برنامه	تاریخ شروع طبق برنامه		
				طراحی تفصیلی	۲,۴
۹۷,۵	۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۰		
۱۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	نقشه های تفصیلی معماری	۲,۴,۱
۱۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	نقشه های تفصیلی سازه	۲,۴,۲
۹۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	نقشه های معماری داخلی	۲,۴,۳
۱۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	نقشه های تفصیلی مکانیک	۲,۴,۴



جدول شماره ۷ - گزارش وضعیت پیشرفت وزنی عملیات پایان یافته و در دست اقدام پروژه

۱۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	نقشه های تفصیلی برق	۲,۴,۵
۲- تجهیز کارگاه					
۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	تجهیز اولیه	۳,۱
۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	تسطیح و محصور کردن زمین	۳,۱,۱
۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	تامین تانکر آب و ژنراتور	۳,۱,۲
۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	استقرار کانکسهای دفتری	۳,۱,۳
۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	استقرار کانکسهای کارگری	۳,۱,۴
۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	احداث ابنیه و تاسیسات پشتیبانی	۳,۲
۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	تامین زمین	۳,۲,۱
۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	احداث موتور خانه	۳,۲,۲
۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	احداث انبار	۳,۲,۳
۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	احداث باسکول	۳,۲,۴
		تاریخ خاتمه طبق برنامه	تاریخ شروع طبق برنامه	شرح عملیات	W.B.S
۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	احداث آزمایشگاه	۳,۲,۵
۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	احداث بچینگ	۳,۲,۶
۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	احداث تعمیرگاه	۳,۲,۷
۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	اخذ انشعابات تاسیساتی	۳,۳
۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	اخذ انشعاب تلفن و اینترنت	۳,۳,۱



جدول شماره ۷ - گزارش وضعیت پیشرفت وزنی عملیات پایان یافته و در دست اقدام پروژه

۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	اخذ انشعاب گاز	۳,۳,۲
۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	اخذ انشعاب برق	۳,۳,۳
۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰۹	اخذ انشعاب آب	۳,۳,۴
۳- عملیات اجرائی					
۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	گودبرداری و تحکیم پارت شمالی	۴,۱,۱
۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	دپو و حمل خاک	۴,۱,۱,۲
۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	پایدار سازی دیواره شمالی	۴,۱,۱,۳
۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	پایدار سازی دیواره شرقی	۴,۱,۱,۴
۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	خاکبرداری کنار ملک ۱۴ چاه	۴,۱,۱,۶
۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	پایدار سازی بخش شمالی ضلع غربی	۴,۱,۱,۷
۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱۴ چاه برلنی شمالی	۴,۱,۱,۸
۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	پایدار سازی ۱۴ چاه برلنی	۴,۱,۱,۹
		تاریخ خاتمه طبق برنامه	تاریخ شروع طبق برنامه	شرح عملیات	W.B.S
۱۰۰	۹۹,۸۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	گود برداری و تحکیم پارت جنوبی	۴,۱,۲
۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	دپو و حمل خاک	۴,۲,۱,۱
۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	خاکبرداری کنار ملک ۱۷ چاه	۴,۲,۱,۲
۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	اجرای ۱۷ چاه برلنی	۴,۲,۱,۳
۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	پایدار سازی ۱۷ چاه برلنی	۴,۲,۱,۴



جدول شماره ۷ - گزارش وضعیت پیشرفت وزنی عملیات پایان یافته و در دست اقدام پروژه


۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	پایدار سازی بخش جنوبی	۴,۲,۱,۵
۱۰۰	۹۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	برچیدن رمپ	۴,۲,۱,۶
۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	پایدار سازی ضلع شرقی	۴,۲,۱,۷
۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	پایدار سازی ضلع جنوبی	۴,۲,۱,۸
۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	برچیدن کارگاه پایدار سازی	۴,۲,۱,۹
۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	زهکشی و فونداسیون پارت شمالی	۴,۲,۱
۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	اجرای زهکش کف	۴,۲,۱,۱
۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	اجرای چاه آسانسورهای ۱ تا ۳	۴,۲,۱,۲
۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	اجرای فونداسیون	۴,۲,۱,۳
۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	نصب تاور کرین و آلیماک	۴,۲,۱,۴
۶۶,۸	۱۵,۴۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	زهکشی و فونداسیون پارت جنوبی	۴,۲,۱
شرح عملیات	تاریخ شروع طبق برنامه	تاریخ خاتمه طبق برنامه	درصد انجام شده	درصد طبق برنامه	W.B.S
۴,۲,۲,۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۹	۲۹,۷۷	۹۴	اجرای زهکش کف
۴,۲,۲,۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۵۰	۱۰۰	اجرای چاه آسانسورهای ۴ و ۵
۴,۲,۲,۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۵	۶۱	اجرای فونداسیون
۴,۲,۲,۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۵۰	۰	نصب تاور کرین دوم و سوم
۴,۳,۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۷,۰۲	۴۶,۸۶	اجرای اسکلت و سقفهای زیر زمینی برج شمالی



جدول شماره ۷ - گزارش وضعیت پیشرفت وزنی عملیات پایان یافته و در دست اقدام پروژه

۱۰۰	۷۱,۸۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	طبقه منفی هفت	۴,۳,۱,۱
۱۰۰	۳۹,۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	طبقه منفی شش	۴,۳,۱,۲
۷۴	۳۹,۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	طبقه منفی ۵	۴,۳,۱,۳
۳۷	۲۷,۴۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	طبقه منفی ۴	۴,۳,۱,۴
۱,۵	۲,۷۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	طبقه منفی ۳	۴,۳,۱,۵

نمودار پیشرفت ستونی عملیات پایان یافته و در دست اقدام

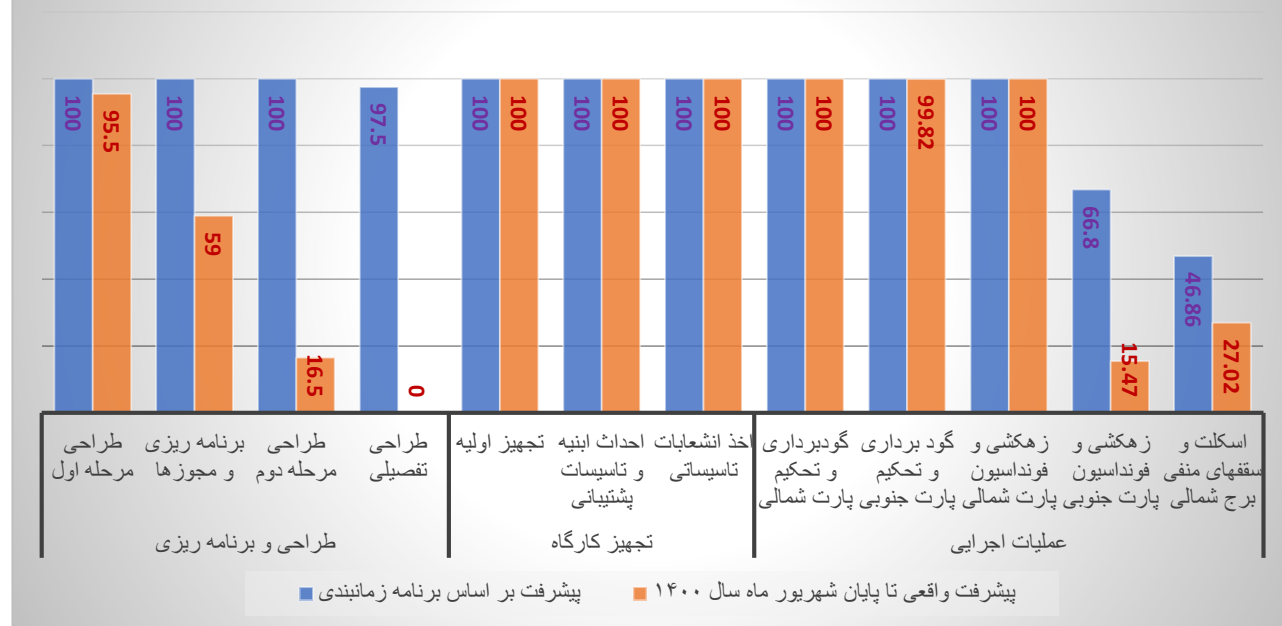

وضعیت منابع پروژه


جدول شماره ۸- شرح ماشین آلات و تجهیزات موجود در کارگاه در شهريور ماه سال ۱۴۰۰

وضعیت ماشین آلات و تجهیزات				
ردیف	شرح ماشین آلات	فعال	غیرفعال	مجموع
۱	بیل مکانیکی هیوندای - دو دستگاه	۳۱	۳۱	۶۲
۲	بیل مکانیکی کوماتسو	۰	۳۱	۳۱
۳	بولدوزر	۰	۳۱	۳۱
۴	لودر	۰	۳۱	۳۱
۵	دستگاه پاشش بتن (شات) - یک دستگاه	۱۷	۱۴	۳۱
۶	دیزل ژنراتور ۱۰۰ KWA	۲۹	۲	۳۱
۷	دیزل ژنراتور ۱۵۰ KWA	۲۹	۲	۳۱
۸	دیزل ژنراتور ۲۰۰ KWA	۲۹	۲	۳۱
۹	کمپرسور SULLAIR ۱۶۰۰-۱۲۵psi خارج شد	۰	۰	۰
۱۰	کمپرسور SULLAIR ۱۶۰۰-۱۵۰psi	۲۹	۲	۳۱
۱۱	کمپرسور SULLAIR ۹۰۰-۱۲۵psi	۵۸	۴	۶۲
۱۲	کمپرسور COMPAIR900-125psi خارج شد	۰	۰	۰
۱۳	دریل واگن - یک دستگاه	۱۷	۱۴	۳۱
۱۴	پمپ بتن - دو دستگاه	۳۲	۳۰	۶۲
۱۵	بچینگ	۱۶	۱۵	۳۱
۱۶	دستگاه تزریق	۰	۳۱	۳۱
۱۷	دستگاه ترانس جوشکاری - چهار دستگاه	۰	۱۲۴	۱۲۴
۱۸	جرثقیل - دو دستگاه	۶۲	۰	۶۲
۱۹	تراک میکسر سه دستگاه	۳۲	۶۱	۹۳
۲۰	بابکت	۰	۳۱	۳۱
۲۱	دستگاه خم آرماتور	۳۰	۱	۳۱
۲۲	دستگاه برش آرماتور	۳۰	۱	۳۱
۲۳	دستگاه خم و برش آرماتور	۳۰	۱	۳۱
۲۴	تاور کرین ۱۲ تن	۳۱	۰	۳۱
۲۵	تاور کرین ۸ تن	۳۱	۰	۳۱
۲۶	رزوه زن	۳۰	۱	۳۱
۲۷	خاموت زن	۳۰	۱	۳۱



نمودار ماشین آلات و تجهیزات موجود در کارگاه در شهريور ماه سال ۱۴۰۰

نمودار ستونی وضعیت ماشین آلات مستقر در پروژه در شهريور ماه سال ۱۴۰۰

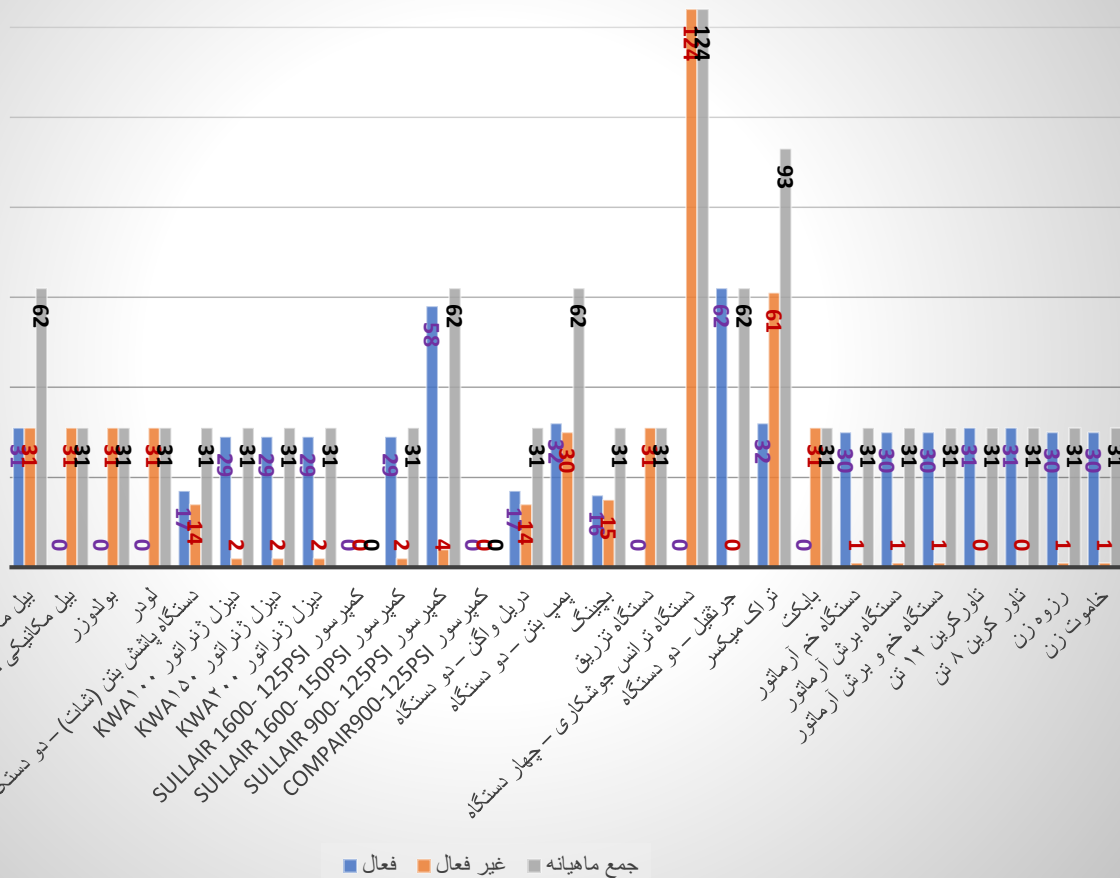




جدول شماره ۹ - شرح نیروی انسانی موجود در کارگاه در شهريور ماه سال ۱۴۰۰

وضعیت نیروی انسانی شریک «نفر - ماه»		
ردیف	نیروی انسانی به تفکیک تخصص	تعداد
۱	مدیر پروژه	۱
۲	رییس کارگاه	۱
۳	مسئول اجرایی	۲
۴	مسئول دفتر فنی	۱
۵	کنترل پروژه	۲
۶	مالی و اداری	۲
۷	جوشکار	۳
۸	خدمات	۱
۹	انبار	۲
۱۰	نقشه بردار	۱
۱۱	سرکارگر	۱
۱۲	کارگر ساده	۲۰
۱۳	حراست	۱۰
۱۴	اپراتور بچینگ	۴
۱۵	پشتیبانی	۲
۱۶	راننده و مکانیک	۸
۱۷	ایمنی	۱


وضعیت نیروی انسانی شریک «نفر - ماه» - تعداد

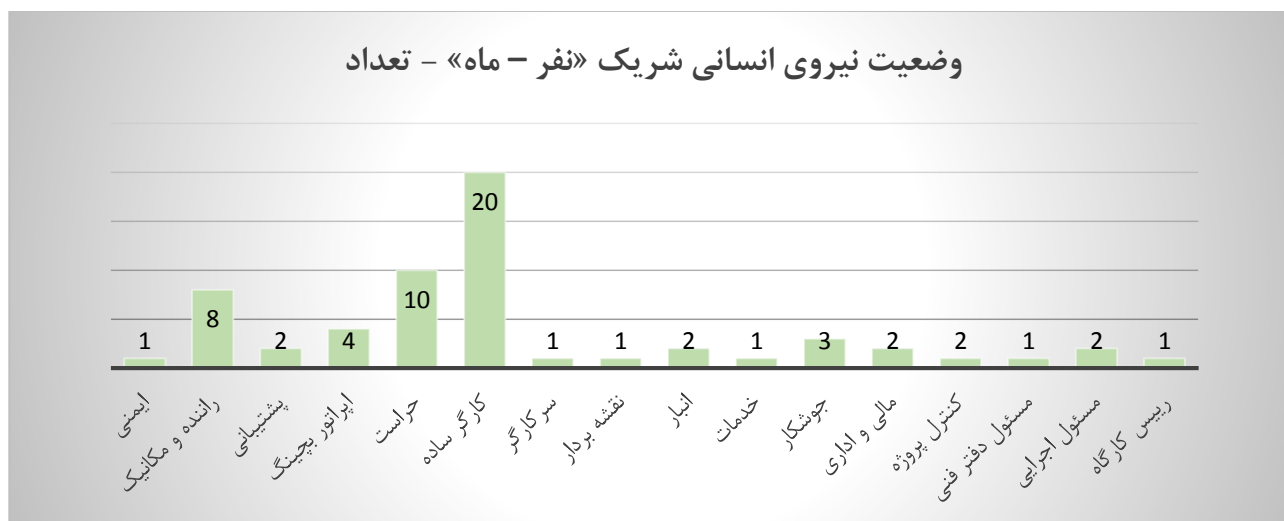

جدول شماره ۱۰ - شرح نیروهای انسانی پیمانکاران شاغل در پروژه

وضعیت نیروی انسانی پیمانکار «نفر - ماه»		
ردیف	پیمانکار	تعداد
۱	بسپار پی (پایدار سازی) اتمام کار	۱۰
۲	رضی پور (خاکبرداری)	۶
۳	اشعری (زهکشی)	۵
۴	کیو بوید (اسکلت بتنی)	۳۵

نمودار نیروی انسانی پیمانکاران «نفر-روز» - تعداد

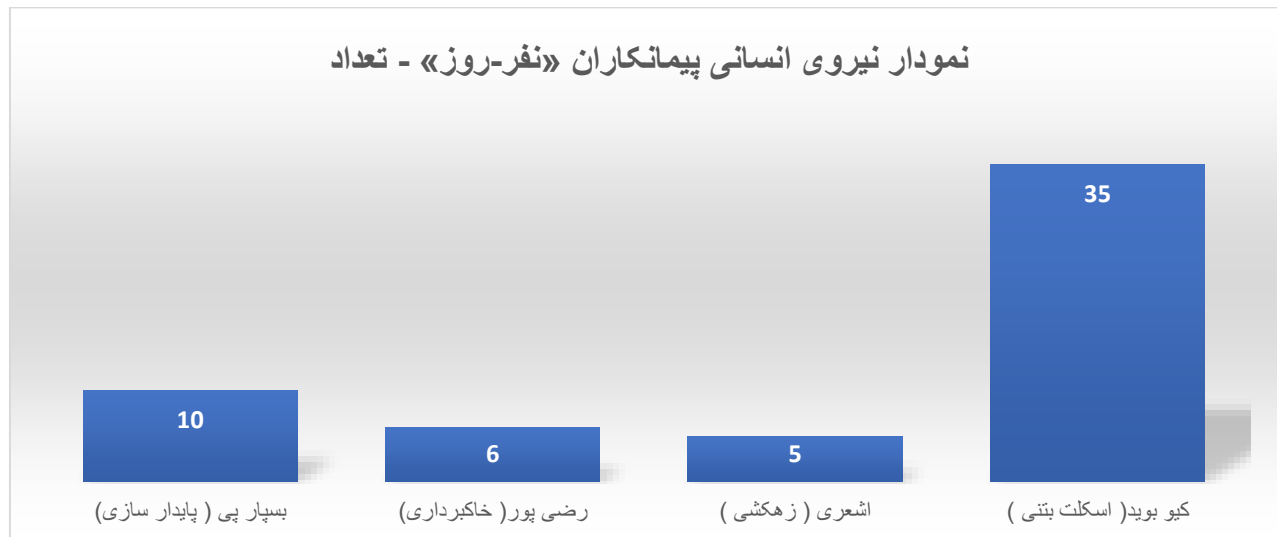

جدول شماره ۱۱ - شرح مصالح وارده به کارگاه در شهريور ماه سال ۱۴۰۰

وضعیت مصالح و متریال (از تاریخ ۱ تا ۳۱ شهريور ماه ۱۴۰۰)			
ردیف	مصالح و متریال	احجام	واحد
۱	ماسه	۱۶۵	کامیون
۲	مش آرماتور	۰	تن
۳	شن	۱۲۰	کامیون
۴	سیمان پاکتی	۴۲۰	پاکت
۵	سیمان فله	اطلاعات لازم از طرف شریک محترم ارائه نمیگردد	
۶	آرماتور	۱۰۰	تن


گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه

تشریح کلی سرفصل های اصلی برنامه زمان بندی بر اساس توضیحات قید شده در برنامه زمانبندی تفصیلی میباشد که به جهت جلوگیری از ازدیاد حجم گزارش ماهیانه از ارائه مجدد آن خودداری گردیده و گزارش جمع بندی کلی به شرح زیر تقدیم میگردد:

جدول شماره ۱۲ - گزارش وضعیت پیشرفت فیزیکی کل پروژه تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
درصد پیشرفت فیزیکی انجام شده	درصد پیشرفت مورد انتظار بر اساس برنامه زمانبندی تفصیلی		درصد پیشرفت در کل پروژه	شرح عملیات	W.B.S
	درصد پیشرفت	PROGRESS			
۰	۰	۰	۰	امضا قرارداد و تحویل زمین	۱
۱,۰۵۲	۲,۹۸۵	۹۹,۵	۳	طراحی و برنامه ریزی	۲
۴	۴	۱۰۰	۴	تجهیز کارگاه	۳
۱۱,۵۲۶	۱۲,۱۰۵	---	۷۵	عملیات اجرائی	۴
۷,۴۸	۷,۵۰	۹۹,۸۲	۱۰	گود برداری و تحکیم	۴,۱
۲,۸۳	۳,۳۲۴	۷۴,۵۴	۵	زهکشی و فونداسیون ساختمان	۴,۲
۱,۲۱۶	۱,۲۸۱	۲۷,۰۲	۶	اسکلت سازه و سقفهای زیر زمینی	۴,۳
۱۶,۷۷۶	۱۹,۰۸۵	جمع کل پیشرفت فیزیکی پروژه:			
۲,۳۰۹ - درصد	تقدم (+) و یا تاخر (-) عملیات اجرایی نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلی:				



نمودار پیشرفت فیزیکی کل پروژه

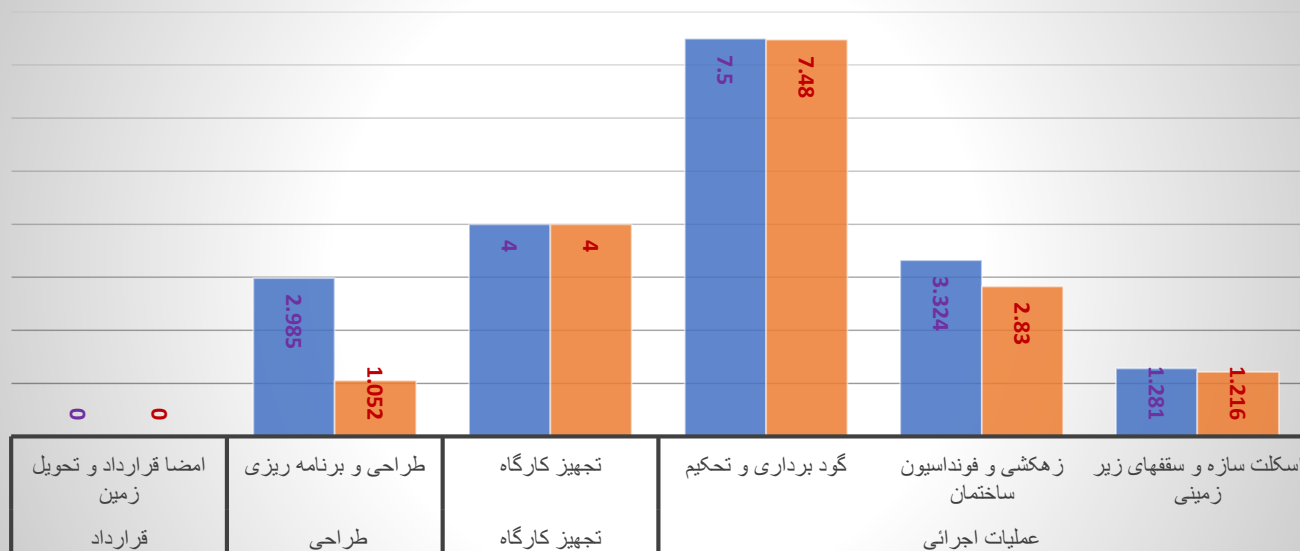


پیشرفت فیزیکی بر اساس برنامه زمانبندی تفصیلی

پیشرفت فیزیکی واقعی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰



نمودارهای پیشرفت پروژه بر اساس برنامه زمانبندی تفصیلی :

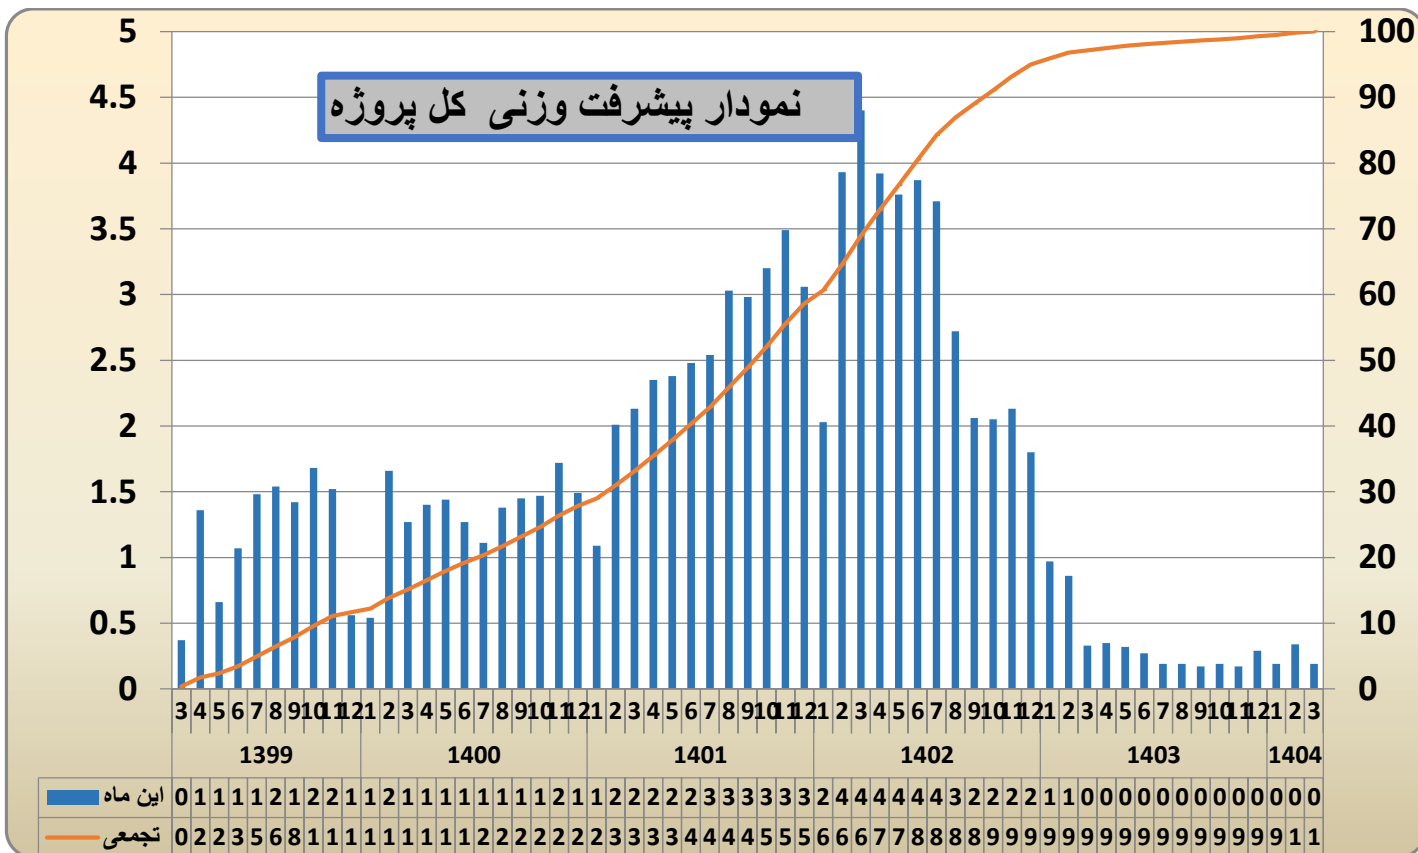



پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دیز

عنوان : گزارش ماهیانه شهريور ماه ۱۴۰۰





مشکلات و موانع پروژه

ردیف	اهم مشکلات و موانع	راهکار و پیشنهادات
۱	کاهش محسوس راندمان اکیپ آرماتور بندی و اجرای سقف	با توجه به رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی لازم توسط شریک محترم، به دلیل شیوع ویروس کرونا در اکیپ فوق عملا عملیات اجرایی به صورتی که خارج از قصور شریک محترم بوده است با توقف مواجه گردیده است و لازم است با افزایش اکیپهای اجرایی نسبت به جبران تاخیرات حاصله اقدام گردد.
۲	عدم ارسال نتایج آزمایشات مقاومت فشاری بتن	با عنایت به مکاتبات صورت پذیرفته تا کنون، لازم است که آزمایشگاه مستقر در پروژه به مدیر طرح معرفی گردیده و منبعد یک نسخه از نتایج آزمایشات مستقیماً از طرف آزمایشگاه به مدیریت طرح ارسال گردد.
۳	محدودیتهای ترافیکی حمل مواد مازاد به بیرون پروژه	نظر به اینکه محدودیتهای فوق در سطح شهر تهران وجود دارد لذا فقط در طول ساعات شب امکان خروج مواد مازاد وجود داشته که این مورد قبل از انعقاد قرارداد با شریک محترم قابل شناسایی بوده است.
۴	ممنوعیت تردد شبانه از ساعت ۲۲ تا ۳ صبح به دلیل شیوع ویروس کرونا	کاهش سرعت جا به جایی مواد مازاد دپو شده در شب

فهرست کارهای پیش بینی شده و لازم الاجرا در شهریور ماه سال ۱۴۰۰

- تهیه و ارسال نقشه های معماری مرحله دو از طرف شریک برای تعاونی
- تهیه و ارسال نقشه های سازه مرحله دو از طرف شریک برای تعاونی
- تهیه و ارسال نقشه های تاسیسات برق و مکانیک از طرف شریک برای تعاونی
- هماهنگی در دیسپلین های معماری، سازه، برق و مکانیک و نهایی شدن فاز دو از طرف شریک
- انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار سیستم ارتینگ از طرف شریک
- طراحی سیستم ارتینگ از طرف شریک
- برآورد مصالح و تامین سیستم ارتینگ از طرف شریک
- نصب تابلوی اصلی برق ساختمان و کابل گذاری برق از پست منطقه تا تابلو از طرف شریک
- اتمام عملیات گودبرداری و تحکیم در پارت جنوبی
- جبران عقب ماندگی عملیات اجرای اسکلت سازه و سقف طبقات منفی هفت و منفی شش و شروع عملیات فوق در طبقه منفی پنج پارت شمالی با توجه به وجود جبهه های کاری لازم.
- جبران عقب ماندگی عملیات احداث زهکشی و فونداسیون در پارت جنوبی با توجه به وجود جبهه کاری.



گزارش تصویری پروژه

عملیات برچیدن رمپ - شهریور ۱۴۰۰



عملیات آرماتور بندی و بتن ریزی چاله آسانسور ۳ - شهریور ۱۴۰۰





عملیات قالب بندی (وافل) و آرماتور بندی سقف طبقات زیر زمینی - شهریور ۱۴۰۰



عملیات آرماتور بندی - شهریور ۱۴۰۰





عملیات اجرای دیوار حایل - شهریور ۱۴۰۰



عملیات عایق بندی دیوار - شهریور ۱۴۰۰





بازدید مدیر عامل محترم تعاونی مسکن جناب مهندس روحانی از پروژه





عملیات ساخت پله بین طبقات شهريور ۱۴۰۰





منشور اقلیم سازه
(سهامی خاص)

پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دینز

عنوان : گزارش ماهیانه شهریور ماه ۱۴۰۰



نمای کلی پروژه شهریور ۱۴۰۰





منشور اقلیم سازه
(سهامی خاص)

پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دینز

عنوان : گزارش ماهیانه شهریور ماه ۱۴۰۰



عملیات بتن ریزی دال سقف شهریور ۱۴۰۰





منشور اقلیم سازه
(سهامی خاص)

پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دینز

عنوان : گزارش ماهیانه شهریور ماه ۱۴۰۰

